



รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ
(โขง ชี มูล)

คำนำ

เอกสารสรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้ จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ประสาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๙ (๓) บัญญัติว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด

หากเอกสารเล่มนี้ ยังขาดข้อมูลและมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหากท่านคิดว่าสิ่งใดที่จะมีคุณค่า และมีประโยชน์ที่สมควรปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นในโอกาสต่อไป

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดฯ	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
๒.๑ จังหวัดศรีสะเกษ	๙
๒.๒ จังหวัดยโสธร	๔๕
๒.๓ จังหวัดอุบลราชธานี	๙๓
๒.๔ จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑๒

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑.ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รายงานตรงต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

การจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างการบริหารงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

๒.ลักษณะทางกายภาพ


ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ตั้งอยู่ในตอนล่างของประเทศ ไทยประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๓๑,๙๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙,๙๔๒,๓๓๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๖.๒ ของพื้นที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านระยะทางรวม ๖๐๑ กิโลเมตร ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี	มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง ๓๖๑ กิโลเมตร
	มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ	มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร
จังหวัดอำนาจเจริญ	มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ	มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก	มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก	มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินทร์
ทิศใต้	มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

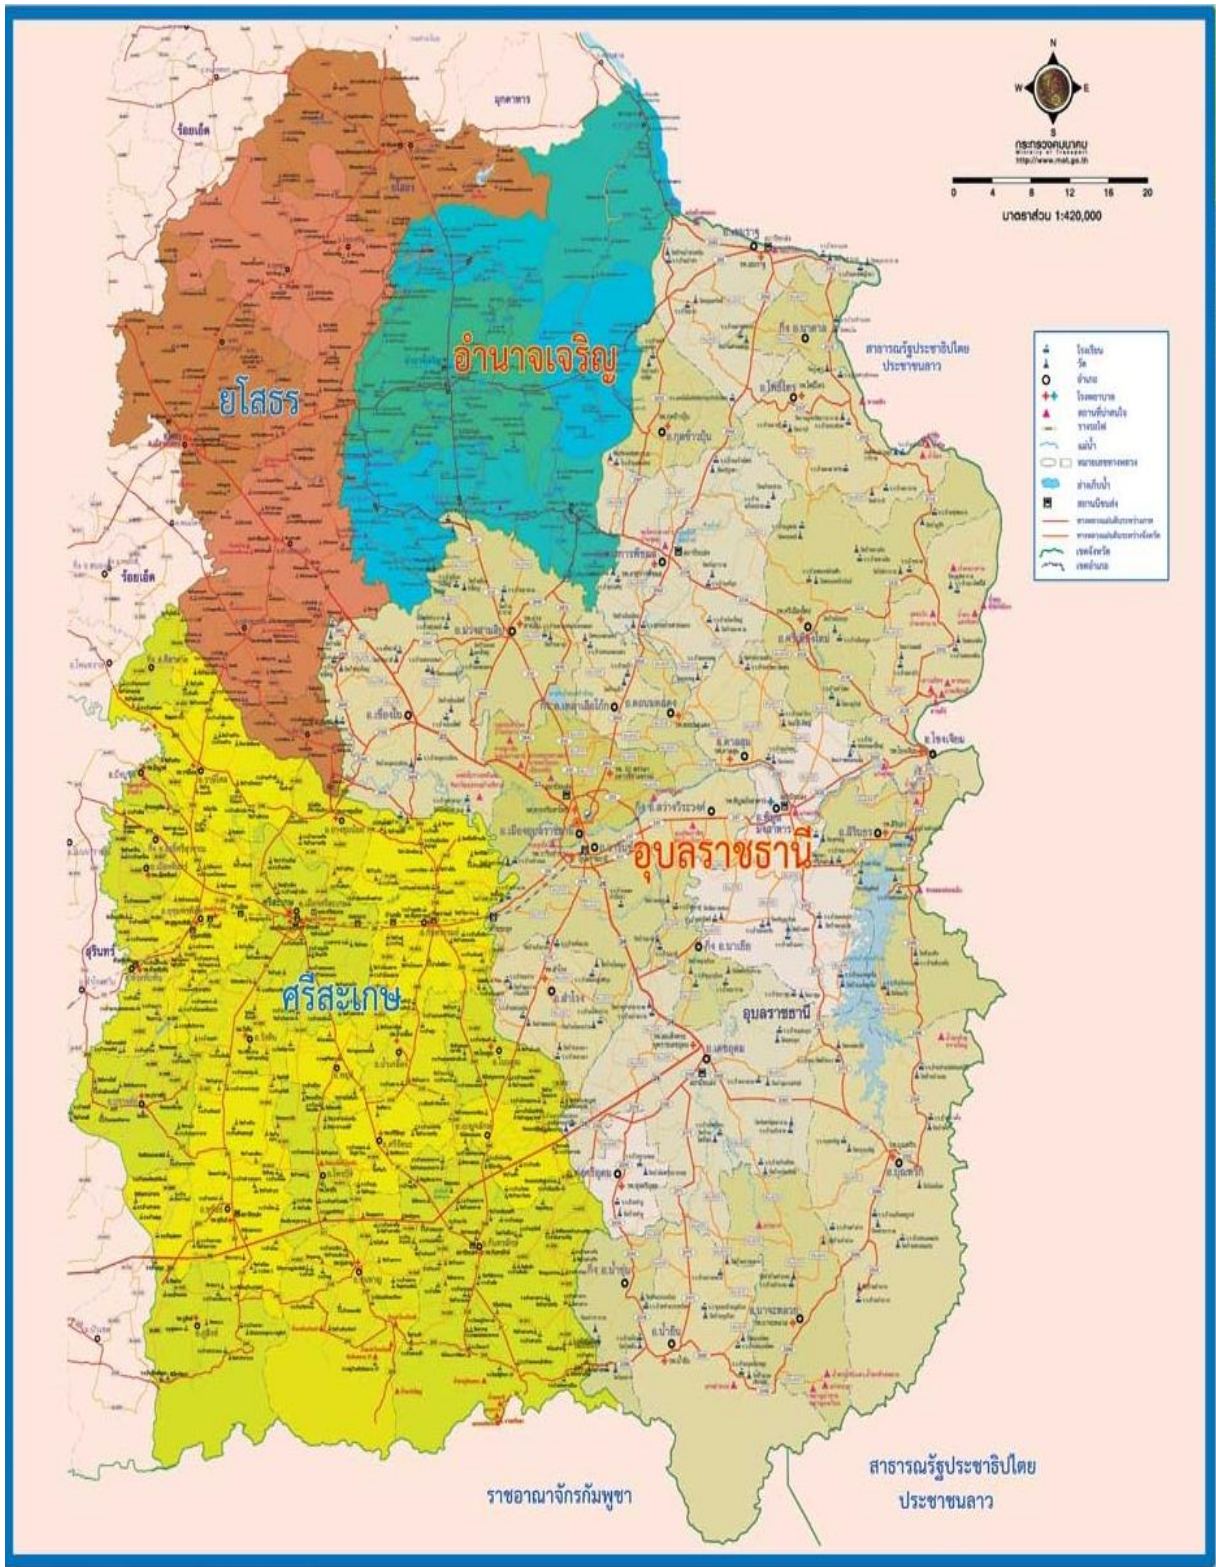

ภาพที่ ๑ แสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒


ขนาดพื้นที่

กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๕๙๒ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๕๗๕ กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ๓๑,๙๐๗.๗๒๘ ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๔ รองลงมาคือ ศรีสะเกษร้อยละ ๒๗.๗๐ ยโสธร ร้อยละ ๑๓.๐๔ และอำนาจเจริญ ร้อยละ ๙.๙๑ ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ แยกรายจังหวัด

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด	เนื้อที่		ร้อยละ (ของกลุ่มจังหวัด)
	ตารางกิโลเมตร	ไร่	
กลุ่มจังหวัด ฯ	๓๑,๙๐๗.๗๒๘	๑๙,๙๔๒,๓๓๖	๑๐๐.๐๐
อุบลราชธานี	๑๕,๗๔๔.๘๔๐	๙,๘๔๐,๕๒๖	๔๗.๓๔
ศรีสะเกษ	๘,๘๓๙.๙๗๖	๕,๕๒๔,๙๘๕	๒๗.๗๐
ยโสธร	๔,๑๖๑.๖๔๔	๒,๖๐๑,๐๔๐	๑๓.๐๔
อำนาจเจริญ	๓,๑๖๑.๒๔๘	๑,๙๗๕,๗๔๘	๙.๙๑

ที่มา: สำนักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

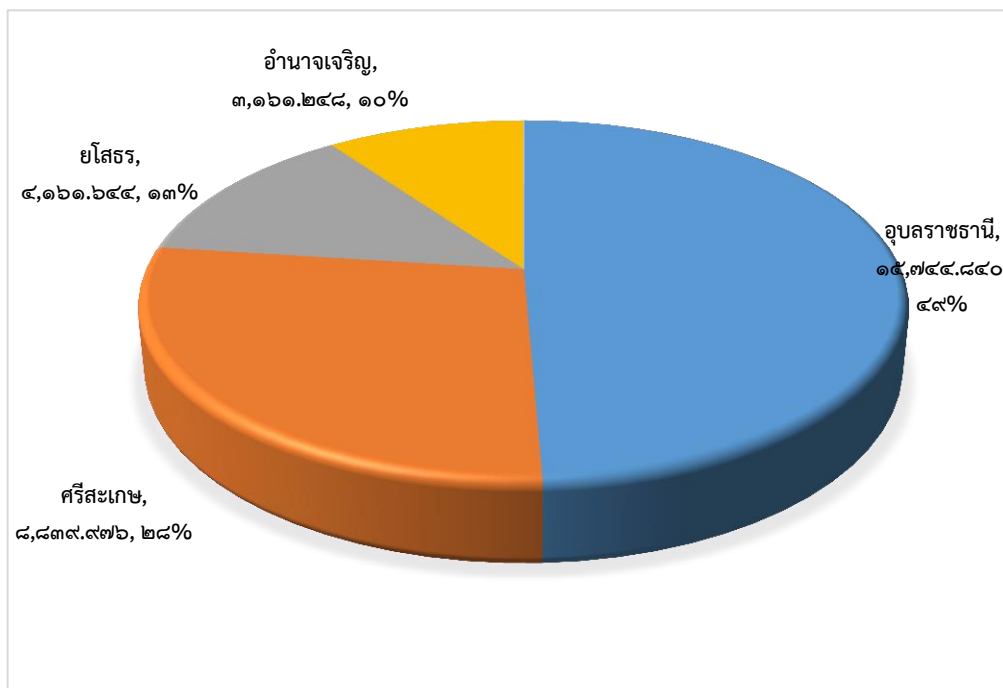

ภาพที่ ๒ สัดส่วนพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กับจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๘ กิโลเมตร โดยจังหวัดที่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดมากที่สุด คือ ยโสธร ๙๘ กิโลเมตร อำนาจเจริญ ๗๕ กิโลเมตร และศรีสะเกษใกล้ที่สุด ๖๑ กิโลเมตร

ตารางที่ ๒ ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กับศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

จังหวัด	ระยะทางห่างจากศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
ศรีสะเกษ	๖๑ กิโลเมตร
ยโสธร	๙๘ กิโลเมตร
อำนาจเจริญ	๗๕ กิโลเมตร

ที่มา: สำนักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลักษณะภูมิประเทศ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพป่าและภูเขา มีแหล่งน้ำขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ำสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ำ

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin) สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงต่ำสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำมูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมมีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทางตอนใต้ มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๕,๓๔๐.๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๓๗,๙๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๗๒๑.๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕๑,๑๗๒ ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘.๑๗ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เป็นที่อาศัยและอื่น ๆ อีกประมาณ ๒,๗๗๗.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๓๕,๘๔๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด บริเวณที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณแม่น้ำมูล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอราศีไศล ยางชุมน้อย และกันทรารมย์ เทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ด้านใต้ของจังหวัด กั้นเขตแดนไทย - กัมพูชา

จังหวัดยโสธร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง โดยมีพื้นที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ำชี ไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัด อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๒๗ ฟุต มีพื้นที่เป็นภูเขา บางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัดอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอเลิงนกทา อำเภอภูซำโฮง สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ ทำการเกษตรไม่ค่อยดีนัก

จังหวัดอำนาจเจริญ มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๖๘ เมตร สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นจังหวัดอำนาจเจริญกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อำเภอชานุมาน

ลักษณะภูมิอากาศ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒.๑ - ๔๑.๑ องศาเซลเซียส

จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดอื่น ๆ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม จากนั้นจะเริ่มร้อนอบอ้าวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๕.๘ - ๓๕.๔ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๓๑.๐-๙๖.๐ สภาพอากาศของศรีสะเกษแบ่งเป็น ๓ ฤดู โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

จังหวัดยโสธร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ – ๔๑.๑ องศาเซลเซียส

จังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันแรก)

- เวลา ๐๗.๓๐ น. -คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
- เวลา ๐๙.๐๐ น. -ประชุมขอทราบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
- ๑.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)
หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
- ๒.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒๕๖๓)
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ,
สนง.ประมงจังหวัดศรีสะเกษ
- ๓.โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (๒๕๖๒)
หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๑.๐๐ น. -คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ๔.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัด (๒๕๖๑)
-กิจกรรมก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในสวนสมเด็จพระศรี-
นครินทร์ศรีสะเกษ หน่วยดำเนินการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๒.๐๐ น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๓๐ น. ๕.โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๒)
-กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคารแบบรูปสมุนไพรและโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
- ๖.โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกลุ่มปลูก
สมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๒๕๖๓)
-กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงผลิต ๓ แห่ง
หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๗.๓๐ น. -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันที่สอง)

- เวลา ๐๗.๓๐ น. -คณะนิเทศติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
- เวลา ๐๙.๐๐ น. -คณะนิเทศติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้
- ๑.โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมชุดตลอดคลองอีสานเขียวบ้านยาง เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๒) หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ
- กิจกรรมชุดลอกแหล่งน้ำปริมาตรดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร และคันดินบดอัด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
- กิจกรรมก่อสร้างอาคารระบบน้ำล้น แบบ ค ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
- กิจกรรมก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ๒. โครงการชุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร ตำบลมือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (เหลือจ่าย ๒๕๖๒)
- กิจกรรมชุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ
- เวลา ๑๒.๐๐ น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. -คณะนิเทศติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศาลาเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร (๒๕๖๒)
- กิจกรรมชุดลอกอ่างเก็บน้ำปริมาตรดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- กิจกรรมซ่อมแซมคอลกรีดตาดคลองตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- กิจกรรมชุดลอกตะกอน ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ และกำจัดวัชพืช ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ
- เวลา ๑๗.๓๐ น. -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

๑.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๓,๖๕๔,๕๔๕ บาท

กิจกรรม ๑) พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะผ้าทอมือ

๒) การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาระดับ

๓) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานทั้งหมด ๓ กิจกรรม คือ

๑) พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถี ลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะผ้าทอมือ จัดในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒) การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาระดับ
อยู่ระหว่างร่าง TOR จัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๓) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ กลุ่มๆละ ๒ คน ซึ่งจะดำเนินการในห้วง
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เร่งรัดดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ภายในกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้มีการคัดเลือก

(ไม่ได้ลงพื้นที่นี้เทศ เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษขอรายงานในที่ประชุมฯ แทน)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายหอมมือ

รายการภายใต้กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายหอมมือ
วงเงิน ๘๑๘,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ยกระดับ จำนวน ๑ ครั้ง (ในประเทศไทย) วงเงิน ๒,๓๔๘,๕๒๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์)
เป็นเงิน ๔๘๗,๗๒๕ บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๓,๖๕๔,๕๔๕ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดิษฐา บุญชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๖๑๑๔๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุดสัญญา

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน (วงเงินตามสัญญา) บาท

ผลเบิกจ่าย..... บาท

คงเหลือ..... บาท

เงินเหลือจ่าย..... บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....

ผลการดำเนินงาน.....

ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายจรินทร์ รอบการ)

พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๑๘,๘๘๕,๕๓๔ บาท

กิจกรรม ๑) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

๒) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

๓) กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

หน่วยดำเนินงาน ๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

๓) สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

การดำเนินการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ จะเริ่มคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ๕ อำเภอ และสามารถก่อก่อนนี้ผู้กฟนได้ทั้งหมดในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ รายในอำเภอศีลาลาดโดยเลือกเกษตรกรที่สนใจจริงๆ และเคยผ่านเกษตรอินทรีย์มาแล้ว

๓) กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มเก่าจะจัดอบรม ๓ ครั้งในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่วนเกษตรกรกลุ่มใหม่จะจัดอบรม ๔ ครั้งในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี ๔ กิจกรรมย่อย คือ

(๑) จัดอบรมการปลูกพืชผักอินทรีย์ ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว,มันสำปะหลัง,พืชผัก,พืชสมุนไพรและผลไม้

(๒) ตรวจประเมินแปลง ๓ ครั้ง

(๓) มีการจัดซื้อวัสดุ ปัจจัยการผลิต ขณะนี้ได้กำหนดคุณลักษณะไว้แล้ว คาดว่าจะก่อก่อนนี้ได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

(๔) ติดตามนิเทศและประเมินผลดำเนินงานในห้วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการรีบเร่งในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ เพราะจะเข้าสู่ฤดูกาลการเกษตรแล้ว และให้ดำเนินการตามแผน

(ไม่ได้ลงพื้นที่นิเทศ เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษขอรายงานในที่ประชุมฯ แทน)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

รายการภายใต้กิจกรรม

๑ ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐ บาท

๒ ค่าใช้สอย ๑๑๕,๗๕๐ บาท

๓ ค่าวัสดุ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ นายธนศล นวลจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สถานที่ติดต่อ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๗๒๔๗๓๒๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐

คงเหลืองบประมาณ ๐

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๐

ผลการดำเนินงาน ๐

ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

(นายธนศล นวลจันทร์)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ราชการกรม
ประมงจังหวัดศรีสะเกษ

๓. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๒,๐๓๘,๓๙๐ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเก่าและเกษตรกรกลุ่มใหม่โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ๒๒ อำเภอ เกษตรกรกลุ่มเก่า มี ๑๗ กลุ่มๆละ ๓๐ ราย เกษตรกรกลุ่มใหม่มี ๕๑ กลุ่มๆละ ๓๐ ราย ลักษณะการดำเนินงานเป็นการอบรมให้ความรู้ การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป สนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษให้คำปรึกษาเพื่อให้กลุ่มสมาชิกมีความเข้มแข็งต่อไป

(ไม่ได้ลงพื้นที่นี้เทศ เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษขอรายงานในที่ประชุมฯ แทน)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรม การเตรียมความพร้อมและปรับแนวคิด*

รายการภายใต้กิจกรรม

- ๑.....
- ๒.....
- ๓.....
- ๔.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๓๘,๓๙๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ นายธวัชชัย ดีลาส

โทรศัพท์ ๐๖๒-๒๐๑๑๔๔๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๖๗๒,๕๓๒ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๓๖๕,๘๕๘ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๕%

ผลการดำเนินงาน.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค.....

.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายธวัชชัย ดีลาส)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัด
กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ




ภาพที่ ๑ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๒ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๓ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

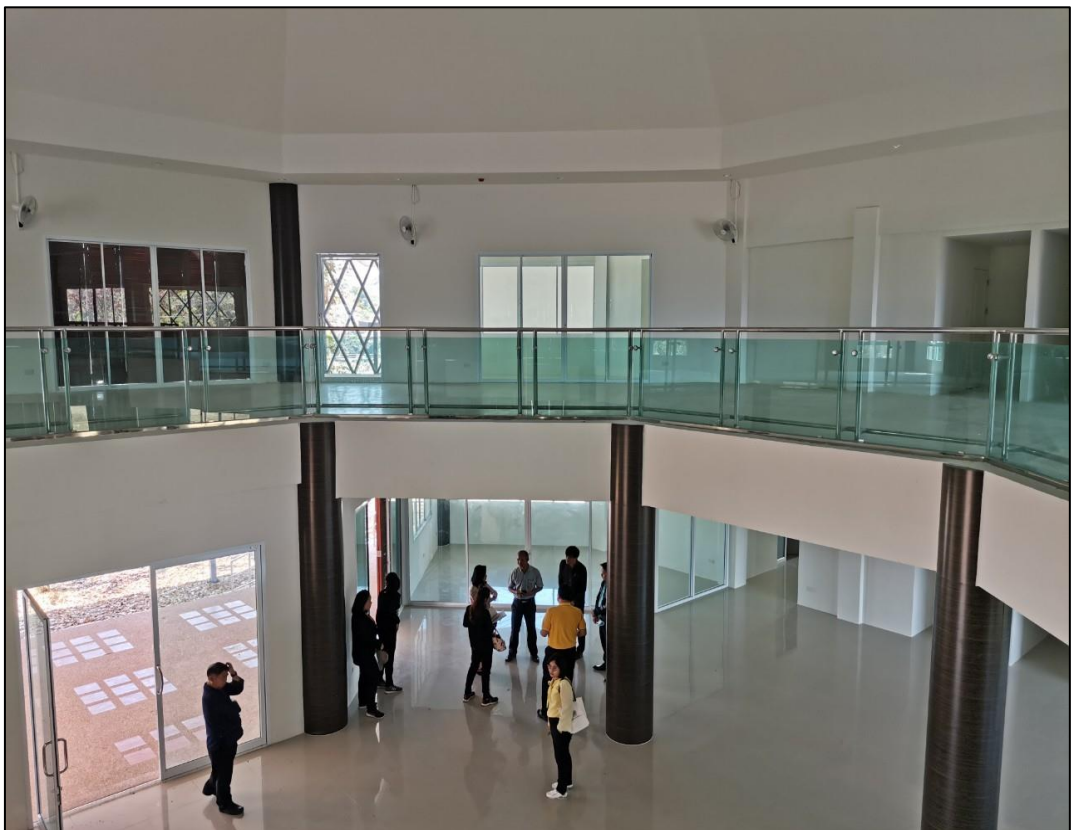

ภาพที่ ๔ ภายในอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๕ ภายในอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๖ ภายในอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

๔. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ ๒๗,๒๒๕,๑๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (งานก่อสร้างอาคารแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ OTOP) ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการส่งมอบสินทรัพย์ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษดูแลรับผิดชอบต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ (งานก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
(OTOP))

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,225,100.-

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ผู้รับผิดชอบ นายธีรพล พงศ์พิระ

โทรศัพท์ ๐๔๕ ๘๑๔ ๕๓๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สัญญาเริ่มต้น ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

งบประมาณก่อนหักเงิน 26,740,000.-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 15,990,520.-

คงเหลืองบประมาณ 10,749,480.-

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 92%

ผลการดำเนินงาน กำลังดำเนินการก่อสร้างส่วนวงเวียนวงกลมสุดท้าย

ตกแต่งนิเวศน์ นิเวศน์อาคาร และส่วนประกอบอื่น ๆ

ปัญหาอุปสรรค.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ (นายพิศุทธิ์ศักดิ์ รัตนวรรณ)ผู้รายงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ.....)

๕.โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรและโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์



ภาพที่ ๑ โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ โรงเรือน



ภาพที่ ๒ โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ โรงเรือน



ภาพที่ ๓ แสดงภาพภายในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๔ อาคารแปรรูปสมุนไพรขนาดกลาง ๑ หลัง โรงพยาบาลห้วยทับทัน
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๕ แสดงภายในโรงงานแปรรูปสมุนไพร



๑.เครื่องบดร่อนแบบ Pin mill



๒.เครื่องบรรจุชาขงสมุนไพรอัตโนมัติ



๓. เครื่องล้างสมุนไพรมนไฟ



๔. ตู้อบสมุนไพรมนไฟ

ภาพที่ ๖ ครูภัณฑ์ ภายในอาคารแปรรูปสมุนไพรมนไฟ



ภาพที่ ๗ อาคารแปรรูปสมุนไพรมนไฟ โรงพยาบาลห้วยทับทัน
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๕. โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๗,๔๒๙,๓๐๐ บาท

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรและโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๑

สัญญาสิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมทั้งหมด ๓ กิจกรรม

- ๑) ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ ๑ โรง
- ๒) ก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ โรง
- ๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน ๑๐ รายการ
- ๔) ค่าวัสดุต่างๆ ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้หน่วยดำเนินงาน ให้ดำเนินการเรื่องส่งมอบทรัพย์สินให้กับโรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) จำนวนกลุ่มปลูกสมุนไพรในเขตอีสานตอนล่าง ๒ ยังผ่านมาตรฐานอินทรีย์ค่อนข้างน้อย
- ๒) เกษตรกรไม่นิยมปลูกสมุนไพรที่ใช้เวลานานในการให้ผลผลิต เช่น มะขามป้อมใช้เวลา ๕ ปี และไพล ๒ ปี ทำให้สมุนไพรกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มขาดความยั่งยืน
- ๓) กลุ่มปลูกสมุนไพรขาดงบประมาณในการส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรแห้งเพื่อขอใบวิเคราะห์คุณภาพหลังแปรรูปสมุนไพร
- ๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้แล้วเสร็จจริงๆจำเป็นต้องใช้เวลาให้ผลผลิตเกษตรกรก่อรายได้จริงๆ อย่างน้อย ๒-๓ ปี
- ๕) ขาดประสบการณ์/ทำแปลนล่วงหน้า/เร่งประกวดราคา

ข้อเสนอแนะ

- ๑) สร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกร่วมกัน ระหว่าง เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์วิจัยพืชสวน เพื่อพัฒนาและผลักดันให้แปลงปลูกผ่านมาตรฐานอินทรีย์ ให้มากกว่า GAP
- ๒) สมุนไพรที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมสูงในการรอผลผลิตได้ ให้เป็นกลุ่มปลูก และสนับสนุนพันธักกล้า
- ๓) สร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกสมุนไพร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ หรือ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบให้กับเกษตรกร

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 ๒. โครงการ : โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ
 ๓. กิจกรรม :
 ๑. ก่อสร้าง อาคารแปรรูปสมุนไพร จังหวัดศรีสะเกษ ๑ โรง
 ๒. ก่อสร้าง โรงตากแห้งสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ โรง
 ๓. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่างๆ จำนวน ๑๐ รายการ
 ๔. งบดำเนินการ (ค่าวัสดุ)
 ๔. งบประมาณ : ๗,๕๗๗,๓๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : 6,212,929 + 40,000(งบดำเนินงาน) = 6,252,929
คงเหลือ : 1,176,371
 ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ระดับชาติ : แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564
ระดับกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 : การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ สมุนไพร ปลอดภัยและประมงด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
 ๖. วัตถุประสงค์ :
 - 1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัดศรีสะเกษเข้าสู่เมืองสมุนไพรในอนาคต
 - 2) เพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับเกษตรกรกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2
 ๗. หน่วยงานในการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ
 - 1) รพ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
 - 2) รพ.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
 - 3) รพ.สศ.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ
 ๘. ระยะเวลาดำเนินโครงการ1..... ปี เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2561..... สิ้นสุดปีกันยายน 2562
 ๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการเสร็จแล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
 - 1) เกษตรกรกลุ่มปลูก :
มีการขยายฐานเกษตรกรกลุ่มปลูกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 กลุ่ม/ปี
มีการกำหนดราคาวัตถุดิบสมุนไพรและการรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากเกษตรกร
มีการกระจายวัตถุดิบสมุนไพรไปยังโรงงานผลิตยาสมุนไพรและภาคเอกชน
 - 2) อาคารสถานที่ :
มีการดูแลรักษาโดยทีมสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(ENV)ของแต่ละหน่วยงาน
 - 3) ครุภัณฑ์ :
มีคู่มือการบำรุงรักษาและมีการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยองค์การบริการส่วนท้องถิ่น สนับสนุนบริการสุขภาพ อุบลราชธานี
1. จำนวนกลุ่มปลูกสมุนไพรในเขตพื้นที่ส่วนตอนล่าง 2 มีจำนวนมาตรฐานเชิงวิธีคิดเช่นข้างนี้
2. เกษตรกรไม่ยึดมั่นปลูกสมุนไพรที่ให้อาหารในปริมาณน้อย เช่น มะขามป้อมใช้เวลา 5 ปี และโผลด 2 ปี ทำให้อายุปลูกกลุ่ม
เหล่านี้มีแนวโน้มขาดความยั่งยืน
3. กลุ่มปลูกสมุนไพรขาดประสบการณ์ในการส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อขอใบวิเคราะห์คุณภาพตั้งแต่แปรรูป
สมุนไพร
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในด้านต่างๆจำเป็นต้องใช้วงเงินของงบอุดหนุนที่จ่ายให้จริงๆ อย่างน้อย 2-3 ปี
๑๐. แนวทางแก้ไข :
1. สร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกสมุนไพร ระหว่าง เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์วิจัยพืชสวน เพื่อพัฒนาและผลักดันให้
แปลงปลูกผ่านมาตรฐานสีเขียวได้มากกว่า GAP
 2. สมุนไพรที่ให้อาหารในปริมาณน้อย ควรคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมสูงในการขอผลผลิตได้ ให้เป็นกลุ่มปลูก
และสนับสนุนพื้นที่อีก
 3. สร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกสมุนไพร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ หรือ ผลิต
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจคุณภาพวัตถุดิบให้กับเกษตรกร

ลงชื่อ
(.....นายปรีดา เบตรจำ.....)
ตำแหน่งเกษตรชำนาญการ.....

๖. โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงผลิต ๓ แห่ง



ภาพที่ ๑ พื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์ โรงพยาบาลขุนหาญ ช้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์



ภาพที่ ๒ พื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ บริเวณลานจอดรถ



ภาพที่ ๓ พื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน บริเวณข้างอาคารแปรรูปสมุนไพร



ภาพที่ ๔ พื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
หน้าอาคารโดมกิจกรรม

๖. โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๙,๘๓๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงผลิต ๓ แห่ง

หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นการต่อยอดจากโครงการเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ

- ๑) เป็นการก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพรพร้อมครุภัณฑ์
- ๒) โรงงานผลิตยาน้ำพร้อมครุภัณฑ์
- ๓) โรงงานผลิตเครื่องสำอางพร้อมครุภัณฑ์
- ๔) ศูนย์กระจายสินค้าพร้อมครุภัณฑ์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด.....ศรีสะเกษ.....ข้อมูล ณ วันที่๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

ชื่อโครงการ.....เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๒.....

กิจกรรม....สร้างเครือข่ายกลุ่มปลูกสมุนไพร และสิ่งปลูกสร้างพร้อมครุภัณฑ์.....

รายการภายใต้กิจกรรม

1. โรงงานผลิตย่น้ำสมุนไพร ๑ แห่ง
2. โรงงานแปรรูปสมุนไพร ๑ แห่ง
3. โรงงานเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๑ แห่ง
4. มีศูนย์กระจายสินค้าจากเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๑ แห่ง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.๒๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ..ภญ.สิรินญา เกิดสิน และ ภก.ปรีธดา เนตรสง่า.....

โทรศัพท์.....๐๘๙๓๙๒๘๙๓๘ , ๐๙๐๒๔๘๕๖๘๗

ปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๓ สัญญาเริ่มต้น.พ.ศ. ๒๕๖๓ . สิ้นสุด.. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

งบประมาณก่อนหักเงิน..... ๒๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ..... ๐๐.๐๐ บาท.

คงเหลืองบประมาณ..... ๒๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....๒๐

ผลการดำเนินงาน....ด้านการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้าง มีแบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ และ BOQ
พร้อมคุณลักษณะครุภัณฑ์ และไม่พบว่ามีกรรื้อถอนสิ่งก่อสร้างประเภทถาวร ทั้ง ๔ พื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค.....ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณ

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ปรีธดา.....ผู้รายงาน
(นายปรีธดา เนตรสง่า)

๗. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านยางเพื่อสนับสนุน พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม ชุดลอกแหล่งน้ำปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร และคันดินบดอัด ตำบลน้ำคำ

กิจกรรม ก่อสร้างอาคารระบบน้ำล้น แบบ ค ตำบลน้ำคำ , กิจกรรม ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ ตำบลน้ำคำ



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ (ก่อนดำเนินการ)



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ (หลังดำเนินการ)



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๗. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านยางเพื่อสนับสนุน พื้นที่เกษตร
แปลงใหญ่ บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ชุดลอกแหล่งน้ำปริมาตรชุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร,ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นแบบ ค ,
ก่อสร้างทางระบายน้ำ(ก่อสร้างท่อลอดถนน ชนิด ๗-๒),ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ

หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ชุดลอกแหล่งน้ำปริมาตรชุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร,ก่อสร้างทางระบายน้ำล้น
แบบ ค , ก่อสร้างทางระบายน้ำ (ก่อสร้างท่อลอดถนน ชนิด ๗-๒),ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ ปัจจุบันโครงการ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ เกิดภาวะฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ดำเนินการ
ก่อสร้างทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด..... ศรีสะเกษ..... ข้อมูล ณ วันที่..... ๑๗/๑๒/๒๕๖๒.....

ชื่อโครงการ.....

กิจกรรม.....ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกคลองอีสานเขื่อนบ้านยางเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่.....

รายการภายใต้กิจกรรม

- ๑) ขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณตรดุดินจุดไม่น้อยกว่า ๕๖.๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๒) ก่อสร้างทางระบายน้ำล้นแบบ"ค"
- ๓) ก่อสร้างทางระบายน้ำ(ก่อสร้างท่อลอดถนน ชนิด๗-๒)
- ๔) ก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ..... นายกรฤต มีเกิดมูล

โทรศัพท์..... ๐๘๖-๘๗๒๖๒๕๘

ปีงบประมาณ พ.ศ..... ๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น..... ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒..... สิ้นสุด..... ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน..... ๘,๘๘๐,๗๑๘..... บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ..... ๘,๘๘๐,๗๑๘


คงเหลืองบประมาณ.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ..... ๑๐๐

ผลการดำเนินงาน..... ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและชุดลอกคลองแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาเร่งรัดการดำเนินการ.....

ปัญหา/อุปสรรค.....เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ เกิดภาวะฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน
จำนวน ๒ ลูก ทำให้เกิดน้ำไหลป่าเข้าท่วมพื้นที่ก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานเบื้องต้นได้
แต่ทั้งนี้ภายหลังจากพายุดังกล่าวได้พัดผ่านไปจนสลายตัว ทางผู้รับผิดชอบได้ทำการเร่งรัดการดำเนินการจน
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เวลาปัจจุบัน.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..... ..... ผู้รายงาน

(นายปัญญา ประชากุล)
นายช่างชลประทานอาวุโส

๘. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร

ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๘.โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร ตำบลผือใหญ่

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เหลือจ่าย)

กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันได หินอ่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานพื้นที่เรื่องการส่งมอบให้กับทางผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันได หินอ่อน พื้นที่ดำเนินการเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่เป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ และได้อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำประโยชน์ (ทำนา) เป็นการชั่วคราว ต่อมาเมื่อโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษในฐานะหน่วยดำเนินการได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ให้เข้าพื้นที่ดำเนินการ แต่ปรากฏว่ามีประชาชนบางกลุ่มคัดค้านการทำโครงการดังกล่าว และได้ยื่นขอความชอบธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษจึงได้ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเข้าตรวจสอบสถานะของที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนี้มีสถานภาพเป็นที่นา จึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากที่นาให้เป็นไปตามลักษณะโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่กำหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่อยู่ระหว่างการเขียนแบบบูรณาการของโครงการ ทั้งหมด ๑๐ โครงการ ซึ่งจะเสนอให้กับสำนักงานที่ดินอำเภออุทุมพรพิสัยดำเนินการเป็นลำดับถัดไป ปัจจุบันโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษได้ชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าว และจะดำเนินการต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการเร่งดำเนินการเรื่องการขอใช้ที่ดินให้เสร็จเรียบร้อย ไม่อย่างนั้นเงินจะตกไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด.....ศรีสะเกษ..... ข้อมูล ณ วันที่.....๑๗/๑๒/๒๕๖๒.....

ชื่อโครงการ.....การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.....

กิจกรรม.....ขุดลอกแก้มลิงหนองโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร ตำบลผือใหญ่.....

รายการภายใต้กิจกรรม

๑) ขุดลอกแหล่งน้ำ บริเวณดินจุด ๒๒,๒๕๐ ลบ.ม

๒) คันดินถมบดอัดแน่น

๓) ปล่อยน้ำขนาด ๕.๑๐๐ ม.

๔) บำบัดหินก่อ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗,๐๐๐๐,๐๐๐ บาท.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....โครงการชลประทานศรีสะเกษ.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายภรต มณีคุณ.....

โทรศัพท์.....๐๙๖-๙๖๒๒๕๙.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๒.....

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....๓,๙๑๒,๓๑๑.๘๓.....บาท.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....บาท.....


คงเหลืองบประมาณ.....๓,๙๑๒,๓๑๑.๘๓.....บาท.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....๐%.....

ผลการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างประสานพื้นที่เรื่องการส่งมอบให้กับทางผู้รับจ้างชั่วคราว.....

ปัญหา/อุปสรรค.....เนื่องจากสิ่งน้ำจะเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบล ผือใหญ่เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์และอนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ชั่วคราว แต่เมื่อมีการแจ้งเข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว พบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปในเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายหลังจากการขุดลอกให้กับทางประชาชนที่ใช้พื้นที่เดิมได้ จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับทางโครงการชลประทานศรีสะเกษ เข้าดำเนินการได้ การดำเนินการจึงล่าช้าออกไป.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายปัญญา ปรากฏ)
นายช่างชลประทานอาวุโส

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศาลาเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร
กิจกรรม ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตาล,กิจกรรม
ซ่อมแซมคอลกรีดตาดคลองตำบลโคกตาล,กิจกรรมขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและกำจัดวัชพืช
ตำบลโคกตาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศาลาเพื่อสนับสนุน
แหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตาล,กิจกรรม
ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง ตำบลโคกตาล,กิจกรรมขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและกำจัดวัชพืช
ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกตาล,กิจกรรม
ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง ตำบลโคกตาล,กิจกรรมขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและกำจัดวัชพืช
ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะงานที่ดำเนินการเองได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
คงเหลืองานขุดลอกซึ่งเป็นลักษณะการจ้างเหมา ขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยจะเริ่ม
ดำเนินการขุดลอกในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากปริมาณน้ำที่คงเหลืออยู่จะเก็บไว้ใช้สำหรับการทำนาปรัง
เมื่อพ้นฤดูกาลการทำนาปรังแล้วจะทำการปล่อยน้ำที่มีอยู่ในอ่างเพื่อทำการ ขุดลอกต่อไป เดิมพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ๒๔,๐๐๐ ไร่ หลังจากโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มอีก
๒๐,๐๐๐ ไร่ คาดว่าจะดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ เกิดภาวะฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนจำนวน ๒ ลูก
ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานเบื้องต้นได้ สามารถ
ดำเนินการได้ประมาณเดือนมีนาคมรอให้อ่างเก็บน้ำพร่องน้ำเพื่อทำนาปรัง

ข้อเสนอแนะ

โครงการชลประทานศรีสะเกษ ดำเนินการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จและดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่าย
ให้เสร็จเรียบร้อย

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด.....ศรีสะเกษ..... ข้อมูล ณ วันที่.....๒๐/๐๒/๒๕๖๒.....

ชื่อโครงการ.....โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสาวโรงเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่เกษตร.....

กิจกรรม.....

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณตมขุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร.....
๒. ซ่อมแซมคอนกรีตอาคารคลอง.....
๓. ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและกวางจั้วซีพีซี.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.....

หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....โครงการชลประทานศรีสะเกษ.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายสุรชัย วันศิริ.....

โทรศัพท์.....๐๘๕-๘๗๗๘๘๘.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๒.....

สัญญาเริ่มต้น.....๒ สิงหาคม ๒๕๖๒..... สิ้นสุด.....๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.....

งบประมาณก่อนหักผูกพัน.....๓,๓๓๖,๒๐๐ บาท.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....


คงเหลืองบประมาณ.....๓,๓๓๖,๒๐๐.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....

ผลการดำเนินงาน.....งานจ้างยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากสภาพพื้นที่หน่วยงานยังมีน้ำท่วมขัง เป็นอ่างเก็บน้ำ.....

ปัญหา/อุปสรรค.....เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ เกิดภาวะฝนตกหนัก เนื่องจากอิทธิพลของพายุไซร่อนจำนวน ๒ ลูก ทำให้เกิดน้ำไหลป่าเข้าท่วมพื้นที่ก่อสร้างจนไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานเบื้องต้นได้ สามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนมีนาคม รอให้อ่างเก็บน้ำพร้อมน้ำเพื่อทำนารัง.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายปัญญา ประชากุล)
นายช่างชลประทานอาวุโส

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดยโสธร
ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กำหนดการ
การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประชุมขอทราบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

- คณะนิเทศและติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

- กิจกรรมก่อสร้างฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด

- กิจกรรม ชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรม บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร (สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

- กิจกรรมงานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร-กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร

ชนิดผิวทางแบบ AC กว้างข้างละ ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ AC กว้างข้างละ ๒.๕๐
เมตร เขตทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓.๐๐ กิโลเมตร

(แขวงทางหลวงยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

- กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย้อย-
บ้านสวน จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง

๕.๕๒๕ กิโลเมตร (บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร)

(แขวงทางหลวงยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ม.๖ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

(สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

๕. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง การแปรรูปเนื้อสัตว์ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร (สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

๖. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

- กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายถนนชยางกูร – ภูถ้าพระตำบล
สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๕.๓๐๐ กิโลเมตร

(แขวงทางหลวงชนบทยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ)

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. โครงการพลังงานทดแทน และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม ก่อสร้างฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด,กิจกรรม ชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด

๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรม บ้านโนนทรายงาม

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๔,๙๔๙,๒๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด, กิจกรรม ชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรม บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอมะนังยโสธร จังหวัดยโสธร

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด, ชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวคุณธรรม บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอมะนังยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะส่งมอบให้หน่วยงานในท้องถิ่นดูแลต่อไป ทั้งนี้อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์คือ ๒๐ ปี

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาในการสมทบเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเกษตรกร โดยในโครงการกำหนดให้กลุ่มเกษตรกร ต้องมีการสมทบเข้าร่วมโครงการโดยกลุ่มเกษตรกรต้องดำเนินการก่อสร้างถึงกักเก็บน้ำ และรั้วรอบบริเวณ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม ส่งเสริมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. กิจกรรมก่อสร้างฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒๕ ชุด

๒. กิจกรรมชุดสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒๕ ชุด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๔๙,๒๐๐.- บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการแทนพลังงานจังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ ๐๔๕ ๗๗๓๑๔๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนหน้าผูกพัน ๔,๙๔๙,๒๐๐.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๙๕,๖๘๗.๐๖ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๔,๒๕๓,๕๑๒.๙๔ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๐

ผลการดำเนินงาน การก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จจำนวน ๒๐ แห่ง/ระบบ ปัจจุบันการก่อสร้างงวดที่ ๒ และ ๓ ตามสัญญาจ้างอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค มีปัญหาในการสมทบเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเกษตรกร โดยในโครงการกำหนดให้กลุ่มเกษตรกร ต้องมีการสมทบเข้าร่วมโครงการโดย กลุ่มเกษตรกรต้องดำเนินการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ และรั้วรอบบริเวณระบบผลิตกระแสไฟฟ้า

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นายมงคล พูลเพิ่ม)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการแทน

พลังงานจังหวัดยโสธร

๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ

กิจกรรม งานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร-กุศุม อ.เมือง จ.ยโสธรชนิดผิวทางแบบ AC กว้างข้างละ ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ AC กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร เขตทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓.๐๐ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๒.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๔๐,๑๑๕,๔๐๐ บาท

กิจกรรม งานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร-กุตุ่ม อำเภอมือง จังหวัดยโสธร ชนิดผิวทางแบบ AC กว้างข้างละ ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ AC กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร เขตทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓.๐๐ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

งานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร-กุตุ่ม อำเภอมือง จังหวัดยโสธร ชนิดผิวทางแบบ AC กว้างข้างละ ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดยางแบบ AC กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร เขตทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓.๐๐ กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน แขวงทางหลวงยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ งานบูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร - กุดชุม ย้ำเมืองเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒+๐๘๕ - กม.๕+๓๓๕ (บริเวณงานรวมบริเวณทางแยก) ชนิดผิวทางแบบ AC.....กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดภายใน AC.....กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร เชนทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะขยขบวน ๓.๓๐๐ กิโลเมตร

กิจกรรม บูรณะทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๙ ตอน ยโสธร - กุดชุม ย้ำเมืองเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒+๐๘๕ - กม.๕+๓๓๕ (บริเวณงานรวมบริเวณทางแยก) ชนิดผิวทางแบบ AC.....กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางลาดภายใน AC.....กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร เชนทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร ระยะขยขบวน ๓.๓๐๐ กิโลเมตร

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT
๒. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE
๓. COLD MILLING ๕ CM. DEEP (AVERAGE) จนเก็บที่ ตามจุดที่กำหนดหรือแขวงทางหลวงยโสธร
๔. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE ๒๐ CM. DEEP
๕. PRIME COAT
๖. TACK COAT
๗. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING W/ U RE - PAVING ๗ CM. (RECYCLING ๓ CM. + ASPHALT CONCRETE ๔ CM.)
๘. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
๙. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK ON PRIME COAT
๑๐. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK ON TACK COAT
๑๑. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT
๑๒. THERMOPLASTIC WHITE PAINT
๑๓. BI - DIRECTION ROAD STUD
๑๔. งานบริหารการจราจรในระหว่างทำการก่อสร้าง บำรุงมาตรฐานในงานก่อสร้างจุดที่ ๔

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นายศักดิ์พงษ์ วีระนคร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

- ๒ -

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๑๑๕,๕๐๐.- บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงยโสธร
ผู้รับผิดชอบ นายปัญญา หวังดี
โทรศัพท์ ๐๔๖๒๑๑-๙๓๒๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สัญญาเริ่มต้น ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
งบประมาณก่อนหักภาษี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๘,๑๘๘,๗๕๕.- บาท
คงเหลืองบประมาณ ๑๑,๙๒๖,๗๔๕.- บาท
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑%
ผลการดำเนินงาน ได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาแล้วเสร็จเป็นวงรายการ และส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ทั้งสิ้น ๒๓,๖๕๒,๑๒๐.๐๒ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทหกแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) ทั้งสิ้นประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงิน ๒,๓๖๕,๒๑๒.๐๒ บาท คงเหลือค่าจ้างงวดที่ ๑ ๒๑,๒๘๖,๙๐๘.๐๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดบาทสองสตางค์) เมื่อวันถึงงวดงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ได้ทำการก่อสร้างงานตามสัญญาแล้วเสร็จครบทุกงวดตามสัญญาทุกประการ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ (สุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ (สุดท้าย) ทั้งสิ้น ๑๙,๙๓๒,๖๖๓.๐๖ บาท (สิบเก้าพันเก้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทหกสตางค์) ได้รับเงินประกันผลงาน ๑๐% เป็นเงิน ๒,๐๐๓,๒๖๖.๖๖ บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ (สุดท้าย) ทั้งสิ้น ๑๗,๙๒๙,๓๙๖.๔๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามหมื่นบาทสี่สตางค์) เมื่อวันถึงงวดงานงวดที่ ๒ (สุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ปัญหา/อุปสรรค
หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นายศักดิ์พงษ์ วีระนคร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน
จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน

จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการมีความพร้อมเป็นถนนสายหลักที่มีรถสัญจรไปมา โดยจะทำการลอก ซ่อมและทำพื้นใหม่ อยู่ระหว่างรองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ และรอผลการพิจารณารับรองอำนาจทางด้านพัสดุจากอธิบดีกรมทางหลวง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้แขวงทางหลวงยโสธร เมื่อได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงยโสธร.....ข้อมูล ณ วันที่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ชื่อโครงการ.....พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว.....

กิจกรรม.....กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์.....

รายการภายใต้กิจกรรม

๑.....กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านย้อย - บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐ - กม.๒๑๑+๕๐๐ RT. (เป็นช่วง ๆ).....

๒.....

๓.....

๔.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท.....

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงยโสธร.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายปัญญา หวังดี รอ.ขท.ยโสธร (ว).....

โทรศัพท์.....๐ ๔๕๗๑ ๑๕๐๔.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๓.....

สัญญาเริ่มต้น.....-.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....-.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....-.....

คงเหลืองบประมาณ.....-.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....-.....

ผลการดำเนินงาน.....-.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค.....-.....

.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายศักดิ์พงษ์ อีร์เนตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๔ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๘,๘๓๙,๐๘๖ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรายเก่าและรายใหม่ ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะได้รับการส่งเสริม คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์, มันสำปะหลังอินทรีย์, พืชผักอินทรีย์, สมุนไพรอินทรีย์และผลไม้อินทรีย์ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าประเมินความพร้อมของโครงการในพื้นที่ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองตาไก่ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใหม่สำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีสมาชิกทั้งหมด ๓๕ คน ปรากฏว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความพร้อมทั้งในพื้นที่ดำเนินการและกำลังใจในการร่วมทำโครงการแต่ยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจะดูแลรับผิดชอบในส่วนนั้นต่อไป ทั้งนี้โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เมื่อได้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

จังหวัดโคตร

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดโคตร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. กิจกรรม การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๖,๙๙๓,๒๖๖ บาท ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้

๑.๑ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์รายเก่า งบประมาณ
๔,๔๖๘,๓๐๐ บาท เป้าหมาย ๖๐ กลุ่ม เกษตรกร ๑,๘๐๐ คน

๑.๑.๑ พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน PGS จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมาย ๖๐ กลุ่ม เกษตรกร ๑,๘๐๐ คน

๑.๑.๒ การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม จำนวน ๖๐ กลุ่ม ๑,๘๐๐ คน

๑.๑.๓ บุคลากรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม

๑.๑.๔ พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่กระบวนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรีย์ จำนวน ๖ ครั้ง เป้าหมาย ๕ กลุ่ม เกษตรกร ๑๕๐ คน

๑.๑.๕ การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ อำเภอละ ๑ ครั้ง

๑.๑.๖ การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
และการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ

๑.๒ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์รายใหม่ งบประมาณ
๒,๕๒๔,๙๖๖ บาท เป้าหมาย ๓๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๕ คน เกษตรกร ๙๕๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังนี้

๑.๒.๑ การสร้างการรับรู้และปรับแนวคิดการผลิตเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ ๔ จุด
จุดละ ๑ ครั้ง เป้าหมาย ๕๕๐ คน

๑.๒.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
ดำเนินการ ๓๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน

๑.๒.๓ พัฒนาเกษตรกรอาสาผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐาน PGS
จำนวน ๓๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน รวม ๑๑๔ คน ดำเนินการอบรม ๑ ครั้ง ๒ วัน

๑.๒.๔ การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม จำนวน ๓๘ กลุ่ม

๑.๒.๕ บุคลากรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม จำนวน ๓๘ กลุ่ม

๑.๒.๖ การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ

๒. กิจกรรม การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ งบประมาณ ๘๖๗,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้

๒.๑ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์รายเก่า งบประมาณ
๒๖๗,๘๘๐ บาท เป้าหมาย ๓ กลุ่ม เกษตรกร ๙๐ คน

๒.๑.๑ กิจกรรม อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน PGS เป้าหมาย ๓ กลุ่ม เกษตรกร ๙๐ คน จัดอบรมจำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน

๒.๑.๒ การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม จำนวน ๓ กลุ่ม ๙๐ คน

๒.๑.๓ บุคลากรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม

๒.๑.๔ การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
และการประเมินผลโครงการของจังหวัด

๒.๒ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์รายใหม่ งบประมาณ
๕๙๙,๒๒๐ บาท เป้าหมาย ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๕ คน เกษตรกร ๑๐๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๒.๒.๑ สร้างการรับรู้และปรับแนวคิดการผลิตเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ ๓ จุด ๑ วัน
เป้าหมาย ๑๐๐ คน

๒.๒.๒ อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน PGS ดำเนินการ ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน

๒.๒.๓ พัฒนาเกษตรกรอาสาผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มตามระบบมาตรฐาน PGS
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน รวม ๓๐ คน ดำเนินการอบรม ๑ ครั้ง ๒ วัน

๒.๒.๔ การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม

๒.๒.๕ บุคลากรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม จำนวน ๕ กลุ่ม

๒.๒.๖ จัดงานสารคดีก่อนฤดูกาลผลิต ๑ ครั้ง ๑ วัน

๒.๒.๗ การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด

๓. กิจกรรม การผลิตพืชอินทรีย์ งบประมาณ ๒๙๙,๕๐๐ บาท ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

๓.๑ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์รายเก่า งบประมาณ ๑๗๓,๑๐๐ บาท
เป้าหมาย ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน เกษตรกร ๖๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๓.๑.๑ อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน PGS ดำเนินการ ๓ จุด จุดละ ๔ วัน เป้าหมาย ๖๐ คน

๓.๑.๒ ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ จากหน่วยตรวจรับรองภายนอก

๓.๑.๓ การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด

๓.๒ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์รายใหม่ งบประมาณ ๑๒๖,๔๐๐ บาท
เป้าหมาย ๑ กลุ่ม เกษตรกร ๒๐ คน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๓.๒.๑ อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๒๐ คน
จัดอบรม ๑ วัน

๓.๒.๒ อบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป้าหมาย ๒๐ คน จัดอบรม ๖ ครั้ง

๓.๒.๓ ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (แปลงใหม่) จากหน่วยตรวจรับรองภายนอก
เป้าหมาย ๒๐ แปลง

- ๒ -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ -
คงเหลืองบประมาณ -
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ -
ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนการเตรียมการ

๑. ภาครัฐจังหวัดและกรมอภัยมาลัยกลุ่ม/ฝ่าย เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบดำเนินโครงการ และมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. ภาครัฐจังหวัดและกรมอภัยมาลัยกลุ่ม/ฝ่าย ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกรมอภัยมาลัยจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อน
๓. อยู่ระหว่างส่งเครื่องและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวิลาศ อับนัสฎมิ)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๕. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ ครุภัณฑ์ในการดำเนินการ



ภาพที่ ๔ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

๕. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๒,๙๐๒,๐๐ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

๑) เป็นการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร (การแปรรูปข้าว (เส้นขนมจีนอบแห้ง), การแปรรูปผัก และผลไม้, การแปรรูปกล้วย, การแปรรูปเนื้อสัตว์, การแปรรูปถั่วลิสง, ข้าวเกรียบว่าวสมุนไพร, การแปรรูปพริก หอมแดงและการทำเครื่องแกงอบแห้ง, การแปรรูปปลา)

๒) เป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบ เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรมบ้านโนนยาง ได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี, สติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้สินค้าของกลุ่มได้รับการยอมรับและได้รับการสนใจจากลูกค้ามากขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

เหตุการณ์น้ำท่วมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์เกิดความล่าช้าและการจัดงานมหกรรมสินค้าก็เลื่อนกำหนดการจากเดิมมาจัดในเดือนกันยายนแทน

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร เมื่อได้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

รายการภายใต้กิจกรรม

1. การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตร
 - ๑.๑) การแปรรูปข้าว (เส้นขนมจีนอบแห้ง)
 - ๑.๒) การแปรรูปผักและผลไม้
 - ๑.๓) การแปรรูปกล้วย
 - ๑.๔) การแปรรูปถั่วลิสง
 - ๑.๕) ข้าวเกรียบว่านสมุนไพร
 - ๑.๖) การแปรรูปพริก หอมแดงและการทำเครื่องแกงอบแห้ง
 - ๑.๗) การแปรรูปปลา
 - ๑.๘) การแปรรูปเนื้อสัตว์
๒. การสนับสนุนและปัจจัยการผลิตต้นแบบ
๓. การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์
๔. การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๕. การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
๖. การบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองพันบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ นางสุปราณี เวะวงศ์

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๗ ๓๐๑๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สัญญาณเริ่มต้น

สิ้นสุด

งบประมาณก่อนหักภาษี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๕๕๘,๑๕๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คงเหลืองบประมาณ ๒๙๓,๘๕๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผลการดำเนินงาน

๑. กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร งบประมาณ ๒,๙๖๒,๐๐๐ บาท กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๑๒ กลุ่ม ๔๘๐ ราย

- ๒ -

ผลการดำเนินงาน

- การฝึกอบรมเรื่องความพร้อมและปรับแนวคิด

- ๑) การแปรรูปข้าว (เส้นขนมจีนอบแห้ง) จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านโคกเจริญ ตำบล บุ่งคำ อำเภอเมืองกาฬยโสธร ดำเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลน้ำอ้อย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๒) การแปรรูปผักและผลไม้ จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวาน ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๓) การแปรรูปกล้วย จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๔) การแปรรูปถั่วลิสง จำนวน ๑ กลุ่ม ๕๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเมืองกาฬยโสธร ดำเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
- ๕) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสิงห์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และ ๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๕) ข้าวเกรียบว่านสมุนไพร จำนวน ๑ กลุ่ม ๓๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มข้าวเกรียบว่านหนองสิงห์ ตำบลหนองน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดำเนินการในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๖) การแปรรูปพริก หอมแดงและการทำเครื่องแกงอบแห้ง จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ดำเนินการในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มข้าวเกรียบว่านหอมแดง ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๗) การแปรรูปปลา จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มแปรรูปปลาบ้านสุขเกษม ตำบลโนนเปือย อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านบัวขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ดำเนินการในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
- ๘) การแปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๑ ครั้ง ณ กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ดำเนินการในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง ตำบลก้าแมด อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร ดำเนินการวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

- การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปในที่
 - ๑) การแปรรูปข้าว (เส้นขนมจีนอบแห้ง) จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหัตถกรรมบ้านโคกเจริญ ตำบล ปู่คำ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอคีรีง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๒) การแปรรูปผักและผลไม้ จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวาน ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าตอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ ตำบลไผ่ อำเภอทราญกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๓) การแปรรูปกล้วย จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลนาแก อำเภอคำชะอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๔) การแปรรูปกล้วย จำนวน ๓ กลุ่ม ๙๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ดังนี้
 - กลุ่มผู้ปลูกกล้วย ตำบลลุดเชิงซ้อน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลิ้น ตำบลกุดน้ำใส อำเภอคีรีง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๕) ชำรวมเกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน ๑ กลุ่ม ๓๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มตัวมรือบัวว่านหนองเล็ง ตำบลแคนน้อย อำเภอคำชะอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ๖) การแปรรูปพริก หอมแดงและการทำเครื่องแกงอบแห้ง จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสีม่อ ตำบลสีม่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มช่างกลึงอบบ้านห้องพอก ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
 - ๗) การแปรรูปปลา จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ดำเนินการ ณ กลุ่มแปรรูปปลาบ้านสุขเกษม ตำบลโนนนิม อำเภอภูเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านบัวขาว ตำบลม่วง อำเภอทราญกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
 - ๘) การแปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๖๐ ราย จัดอบรม ๒ วัน ณ กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง ตำบลก้ามเตย อำเภอภูเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖ กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการแปรรูปของกลุ่ม
- สนับสนุนครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการแปรรูปให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖ กลุ่ม ดังนี้
 - ๑) การแปรรูปข้าว (เส้นขนมจีนอบแห้ง)
 - เครื่องบดแป้งสแตนเลส ๒ เครื่อง
 - เครื่องโม่เส้น ๒ เครื่อง
 - เครื่องอบแห้งเชิงพาณิชย์ ๒ เครื่อง
 - ๒) การแปรรูปผักและผลไม้
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๔ ตัว
 - ๓) การแปรรูปกล้วย
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๔ ตัว
 - ๔) การแปรรูปกล้วย
 - เครื่องคั่วถั่วมอคอร์ ๓ เครื่อง
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๒ ตัว
 - ๕) ชำรวมเกี่ยวกับสมุนไพร
 - ครกมอคอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๒ ตัว
 - ๖) การแปรรูปพริก หอมแดงและการทำเครื่องแกงอบแห้ง
 - เครื่องผสมเมล็ด ๒ เครื่อง
 - เครื่องปั่น ๒ เครื่อง
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๔ ตัว
 - ๗) การแปรรูปปลา
 - เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล ๕ ก.ก. ๒ เครื่อง
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๔ ตัว
 - ๘) การแปรรูปเนื้อสัตว์
 - โต๊ะคั่วหน้าตู้สแตนเลส ๔ ตัว
- ๓) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน ๑๖ ผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้
- ๔) จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน ๓ ครั้ง ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๓๑-๓๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานบริษัทสยามไบโอเอสเควร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี/ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นโครงการ
 - ๑) ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยี การผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้
๓) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการจำนวน ๑๖ ผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่มีสารหรือสิ่งเจือปนที่ตกเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคบนเงื่อนไขสินค้า ซึ่งผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา จากหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้

๔) กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรแบบรูปเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

- ๑) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) การบริหารจัดการโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสุปราณี ระวังดี)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๖.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายถนนชยางกูร – ภูถ้ำพระ ตำบลสามแยก
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๕.๓๐๐ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๖.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓

งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายถนนชยางกูร – ภูเก้าพระ ตำบลสามแยก

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๕.๓๐๐ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายถนนชยางกูร – ภูเก้าพระ ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๕.๓๐๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการมีความพร้อม เป็นถนนที่ประชาชนในตำบลนิคมคำสร้อยกว่า ๑๘ หมู่บ้าน ประชากรประมาณสามหมื่นกว่าครัวเรือนใช้ในการสัญจรไปมา, ใช้เดินทางไปวัดภูเก้าพระและส่งสินค้าทางการเกษตร เส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดยโสธรได้อีกด้วย ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้แขวงทางหลวงยโสธร เมื่อได้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม : ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนขยางกูร - ภูถ้าพระ ตำบลสามแยก

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๕.๓๐๐ กิโลเมตร

รายการภายใต้กิจกรรม -

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

ผู้รับผิดชอบ : นายปรีชา มูลสาร

โทรศัพท์ : ๐๘ ๑๗๑๘ ๙๔๒๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น - - - - - สิ้นสุด - - - - -

งบประมาณก่อนผู้กผัน - - - - -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - - - - -

คงเหลืองบประมาณ - - - - -

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ - - - - -

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค - - - - -

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมทิศ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันแรก)

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล (๒๕๖๒)

๒.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)

๓.โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (๒๕๖๒)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (๒๕๖๓)

๕.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม (๒๕๖๓)

-กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

๖.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (๒๕๕๙)

-กิจกรรมก่อสร้างพุทธรณเจดีย์จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (วันที่สอง)

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑.โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายในสื่อสาร เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (๒๕๖๓)

๒.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (๒๕๖๓)

๓.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒๕๖๓)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๔.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๖๒)

-กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐เส้นทางศูนย์วิทยุ- เนิน ๕๐๐อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๐.๓๕๐กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร๑.๕๐ เมตร

-กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐เส้นทางแยกฐานอนุพงศ์ – ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร

-กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐เส้นทางถ้ำบอน – แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร

-กิจกรรมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณฐานอนุพงศ์ (สมรภูมิช่องบก) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

-กิจกรรมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert) ข้ามลำห้วยทางขึ้นภูหินด่าง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล
กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล



ภาพที่ ๑ กลุ่มทอผ้ากบบัว จังหวัดอุบลราชธานี



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ กลุ่มทอผ้ากาบบัวกำลังปั่นฝ้าย



ภาพที่ ๔ กลุ่มทอผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี



ภาพที่ ๕ กลุ่มผ้าทอกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี มีผลิตภัณฑ์ OTOP หลากแบบ
อาทิ เสื้อกาบบัว ผ้าถุง ผ้าพันคอ



ภาพที่ ๖ กลุ่มผ้าทอกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี มีผลิตภัณฑ์ OTOP หลากแบบ
อาทิ เสื้อกาบบัว ผ้าถุง ผ้าพันคอ

๑.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๖,๓๘๔,๕๐๐ บาท

กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล เป็นการอบรมให้ความรู้ในการนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ การดำเนินโครงการมี ๒ กิจกรรม คือ

๑) การส่งเสริม การคัดเลือกกลุ่มทอผ้า ที่มีจำนวน ๕๐ กลุ่ม เป็นการอบรมการออกแบบลวดลายผ้า, การออกแบบรูปทรง,การทำสีจากธรรมชาติ,วิธีการสร้างแบรนด์

๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาดเป็นการทำ Road Show ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีจากการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการฯ กลุ่มทอผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๓๐ คน การเย็บผ้า OTOP ซึ่งมีหลายแบบ เช่น เสื้อ ผ้าถุง ผ้าพันคอ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มสามารถนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวได้

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้กลุ่มทอผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าให้ยอดขายสินค้าให้มีเพิ่มมากขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัด.....อุบลราชธานี..... ข้อมูล ณ วันที่.....
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล
กิจกรรมที่ ๑ การค้นหาผลิตภัณฑ์ OTOF ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี
ศักยภาพและคุณลักษณะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ๒ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย
กิจกรรมที่ ๔ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๘๔,๕๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ...๑ ปี... เริ่มตั้งแต่ปี...๑ ต.ค.๒๕๖๑... สิ้นสุดปี...๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒...
งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....
คงเหลืองบประมาณ.....
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....
ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน ๔๕กลุ่มๆ ละ ๒ คน ดำเนินการวันที่
๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอบลูบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๔๑,๕๐๐
บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตาม "Cluster" ดำเนินการระหว่าง
วันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอบลูบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓ รุ่นๆละ ๓๐ คน รวม ๙๐ คน งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ
๒ คน รวม ๓๐ คน งบประมาณ ๑๒๒,๘๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
- กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดย
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ๆ
ละ ๒ คน รวม ๓๐ คน งบประมาณ ๑๒๓,๕๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
- กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดย
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ
๒ คน รวม ๓๐ คน งบประมาณ ๑๒๐,๕๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีบริษัท เจบีค-เทรดดิ้ง
จำกัด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณจำนวน ๙๖๖,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาช่องทางการตลาด OTOF ผู้ตลาดสากล กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOF ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทละ ๑๕ ผลิตภัณฑ์ๆ ละ ๒ คน จำนวน ๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมอบลูบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสน
สามพันบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOF
ครั้งที่ ๑ ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา จำนวน ๕ วัน
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOF กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๔๐
ราย/คู่หา ยอดรายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOF จำนวน ๒,๘๗๐,๕๓๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ครั้งที่ ๒ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา จำนวน ๕ วัน
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทลุง จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOF กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๕๐ ราย/คู่หา ยอดรายได้จากจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOF จำนวน ๓,๕๘๐,๒๕๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ จิราพร หนึ่งสุข ผู้รายงาน
(นางสาวจิราพร หนึ่งสุข)

๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ กลุ่มนาผ้าฝ้าย จังหวัดอุบลราชธานี

๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๗,๐๖๘,๕๖๕ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว เป็นการฝึกอบรมในเรื่องการทำผ้าฝ้ายกลุ่มนภาผ้าฝ้ายกับกลุ่มอาชีพตัดเย็บและแปรรูปจากผ้าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก โดยจะได้รับการอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์, การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ความคาดหวังในอนาคตอยากให้ส่วนราชการจัด Road Show และการเยี่ยมชมจากธรรมชาติ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด.....อุบลราชธานี.....ข้อมูล ณ วันที่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ

ภายใต้กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

แผนงาน: พัฒนาขีดความสามารถการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๖๘,๕๖๕ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ.....สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางจริญญา บุญธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ...

โทรศัพท์.....๐๙๑๘๓๑๑๕๒.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๓.....

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนหักผูกพัน.....-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....-

คงเหลืองบประมาณ..... ๗,๐๖๘,๕๖๕ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....๑%.....

ผลการดำเนินงาน.....อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ.....

.....แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ.....

.....จัดทำร่าง TOR.....

ปัญหา/อุปสรรค.....ภาวะโรคระบาด โควิด ๑๙.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....จริญญา บุญธรรม.....ผู้รายงาน

(..นางจริญญา บุญธรรม.....)

๓. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวกล้อง



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง

๓. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๑๕,๑๔๒,๖๖๐ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า กลุ่มเกษตรกรชาวนาแปลงใหญ่ ร่วมกับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตข้าวอินทรีย์แล้วส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กักทำการเกษตรอินทรีย์ ๑,๗๙๔ ไร่ ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมีสมาชิกทั้งหมด ๖๓ รายผลผลิตของกลุ่มจะมีแปรรูปข้าว, สีข้าว, ข้าวกล้องงอก, ข้าวกล้องพร้อมชง, โดนัทหมุกข้าวกล้อง ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ,โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกเหนือจากการแปรรูปข้าวมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีการคิดสร้างสรรค์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกต่อไป โดยในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มได้รับครุภัณฑ์เป็นเครื่องตรัมตราย์ (Drum Day) ใช้สำหรับปีบอัดอบแห้งข้าวกล้องให้เป็นแผ่นเป็นของทานเล่นที่มีความกรอบอร่อย ในอนาคตกลุ่มฯ อยากรับความช่วยเหลือในการคัดแยกเมล็ดข้าว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสาร คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนอกเหนือจากการแปรรูปข้าวให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุน และคำปรึกษาในเรื่องของการตลาดด้วย

๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ตระกร้าพลาสติกสาร



ภาพที่ ๓ ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า



ภาพที่ ๔ ผลิตภัณฑ์ผ้าถุง

๔. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๓,๘๑๘,๖๐๐ บาท

กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มเป้าหมายตำบลโพธิ์งาม อำเภอเดชอุดม เป็นการอบรมสร้างการรับรู้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ และฝึกทักษะช่องทางจำหน่ายซึ่งกลุ่มเป้าหมายสนใจงานสานตระกร้าพลาสติก, ผ้าเช็ดเท้า, ทอผ้าและผ้าสมัคร หลังจากการได้รับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังว่าจะมีรายได้เสริมหลังเว้นว่างจากการทำเกษตร และที่สำคัญทำให้ชาวบ้านสามัคคีและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานแรงงานอุบลราชธานี เมื่อได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กิจกรรม : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และมีหลักประกันที่มั่นคง
รายการภายใต้กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ ๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานให้แก่แรงงาน

กิจกรรมหลักที่ ๒ : โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

กิจกรรมหลักที่ ๓ : โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ / องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น / หน่วยงานภาครัฐ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๘๑๘,๖๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ ๑. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ : นายกฤตพัฒน์ คุรุชกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๑๔๖๕๕๗

ผู้ประสานงาน : นางสาวสมปอง จันทะศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๒๑๒๕๓๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....(ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการ).....

คงเหลืองบประมาณ.....-

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....-

ผลการดำเนินงาน

- ๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กศน. , ทต.
อบต. และหอการค้าจังหวัด เพื่อสอบถามกลุ่ม/ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ
- ๒) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวางแผนการลงพื้นที่จัดโครงการ/พัฒนาทักษะฝีมือฯ จำนวน ๒๕ อำเภอ
- ๓) ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายเพื่อสอบถามความต้องการและความพร้อมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๔) ประสานพื้นที่ที่มีความพร้อมส่งรายชื่อ / กลุ่มอาชีพ / สถานที่ดำเนินการภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
ซึ่งแต่ละพื้นที่อยู่ระหว่างรวบรวมและส่งข้อมูลให้สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
- ๕) กำหนดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการ
ต้องรองจนกว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา๒๐๑๙ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสมปอง จันทะศรี)

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

๕. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอน้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๕. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิชราลงกรณ ตำบลไทรน้อย อำเภอมะนัง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิชราลงกรณ ตำบลไทรน้อย อำเภอมะนัง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร พื้นที่ดำเนินการมีความพร้อมเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อุทิศให้ดำเนินการ ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด ๓๐๐ วัน

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้แขวงทางหลวงอุบลราชธานี เมื่อได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด อุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

รายการภายใต้กิจกรรม

๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

๒.....

๓.....

๔.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ นายอดิเทพ ตีระมาศวนิช

โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๒๕๕๓๐๑๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนหักผู้ผูกพัน.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ.....

คงเหลืองบประมาณ.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ.....

ผลการดำเนินงาน.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค.....

.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ นายสามารถ สอาดจิต ผู้รายงาน
(นายสามารถ สอาดจิต)

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๖. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณ ๑๙,๙๑๓,๑๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒) ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

มีการปรับปรุงแบบออกแบบประสงค์ และมีการคำนวณราคาที่คาดเคลื่อน จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดหน่วยดำเนินงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัด อุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี

รายการภายใต้กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน งบประมาณ ๒๕๕๙

๒.

๓.

๔.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๙๑๓,๑๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ นายอักรินทร์ นนท

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๕๕๓๓-๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สัญญาเริ่มต้น ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน ๑๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๔๘๕,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คงเหลืองบประมาณ ๑๔,๐๘๔,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกเงินงวดที่ ๑

ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....
(นางวิภาดา นาคมณฑิ)

ผู้รายงาน

๗. โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้วล้อมรัก อุ้นไอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทย
พัฒนาการสมวัย IQ ดี

กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้วล้อมรัก อุ้นไอรักสายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทยพัฒนาการ
สมวัย IQ ดี



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการ

๗. โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก
สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓

งบประมาณ ๓,๔๗๔,๔๐๐ บาท

กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี พบว่า เป็นการอบรมให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒๕ อำเภอๆละ ๘๐ คน มีทั้งหมด ๔ กิจกรรม คือ

๑) สร้างภาคีเครือข่ายเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รอบรู้ ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสารสมวัย ทั้งนี้ จะมีอุปกรณ์การอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๓) ประชุมแกนนำและผู้ดูแลเด็กวัยเรียน เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๔) ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้กับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ดูแลเด็กครูพี่เลี้ยง แกนนำชุมชนเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้งบประมาณแล้วให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อบุคคล วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก รุ่นโตรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทย
พัฒนาการสมวัย IQ ดี

กิจกรรม ประชุม / อบรม
รายการภายใต้กิจกรรม

๑. สหประชาชาติเครือข่าย Child & Family Team (CFT) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพันธกิจ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "รอบรู้ ล้อมรัก รุ่นโตรัก สายใยสื่อสารสามวัย" (วัยเด็ก, วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ) และจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตประเมินเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
- ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "รอบรู้ ล้อมรัก รุ่นโตรัก สายใยสื่อสารสามวัย" (วัยเด็ก, วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ)
- ๒.๒ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (DSPM) ราคาชุดละ ๒,๘๐๐ บาท
- ๒.๓ จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการอ่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท
๓. ประชุมแกนนำ และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมกระบวนการเวทีครอบครัว เพื่อพัฒนาทัศนคติปัญหาจิตใจและอารมณ์
๔. อดบทรื้อแบบแปลนเขียนคู่มือเพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง แกนนำชุมชน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๘,๘๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบ

๑. นางทิพวรรณ โรจนพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๗๒๖๒๒ คือ ๑๕๐๑, ๐๔๕-๒๒๘๙๙๖๕
๒. นางปัทมา วราภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๗๒๖๒๒ คือ ๑๕๐๑, ๐๔๕-๒๒๘๙๙๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สัญญาเริ่มต้น ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
งบประมาณก่อนหักภาษี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
คงเหลืองบประมาณ ๑,๘๘๘,๘๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลการดำเนินงาน

๑. ขออนุมัติโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๘๐๐ บาท
๒. เสนอเอกสารขออนุมัติ รายการกิจกรรม
๓. เสนอเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ๓.๒ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
- ๓.๓ คณะกรรมการพิจารณาผล
- ๓.๔ คณะกรรมการตรวจรับ

ปัญหาอุปสรรค

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางปัทมา วราภรณ์)

๘. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓

งบประมาณ ๑,๒๔๒,๓๐๐ บาท

กิจกรรม เฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม เฝ้าระวังและป้องกันการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นการอบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๒๕ อำเภอ จะมีการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม คือ

๑) จัดประชุมภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นผู้บริหารในระดับอำเภอๆละ ๓๐-๔๐ คน เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๒) ผลิตสื่อ “สัญญาณเตือนเสียงอันตราย แนวทางการช่วยเหลือเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย” เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาชุมชนต้นแบบ เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๔) สัมมนาประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จากสถิติจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมา มีการฆ่าตัวตายปีละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ประสบปัญหาครอบครัว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้งบประมาณแล้วให้ดำเนินการตามแผน

๙. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ



ภาพที่ ๒ พื้นที่ดำเนินการ

๘. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓

งบประมาณ ๓๗,๗๖๒,๘๒๑ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาเหนือเป็นกลุ่มเป้าหมายเก่า ซึ่งปลูกผักอินทรีย์พืชผักอินทรีย์ตามฤดูกาล มีสมาชิกทั้งหมด ๖๐ คน ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เริ่มปลูกผักปลอดภัยตามฤดูกาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัล GMP พืชผักปลอดภัยและได้ส่งขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มจำหน่ายให้กับร้านท็อป (TOP) ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี (Central Plaza Ubonratchathani) และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำหน่ายให้กับแมคโครวารินชำราบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินการต่อยอดในส่วนของผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อนำมาใช้กับพืชผักอินทรีย์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้งบประมาณแล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

- ๑.การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์รายเก่า ๑๐,๗๔๐ รายรายใหม่ ๔,๐๐๐ ราย รวม ๑๔,๗๔๐ ราย
- ๒.การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์รายเก่า ๓,๘๗๐ รายใหม่ ๒,๐๐๐ ราย รวม ๕,๘๗๐ ราย
- ๓.การผลิตพืชผักอินทรีย์รายเก่า ๑,๒๐๐ รายรายใหม่ ๑๐๐ ราย รวม ๑,๓๐๐ ราย
- ๔.การผลิตสมุนไพรอินทรีย์รายเก่า ๑๒๐ รายรายใหม่ ๑๐๐ ราย รวม ๒๒๐ ราย
- ๕.การผลิตไม้ผลอินทรีย์รายเก่า ๑๐๐ รายรายใหม่ ๑๐๐ ราย รวม ๒๐๐ ราย
- ๖.การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จำนวน ๖๐๐ ราย
- ๗.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปรับระบบมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จำนวน ๑๐ กลุ่ม ๑๐๐ ราย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๗๖๒,๘๒๑ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ ๑.นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๓๑๑๐๕
๒.นายศุภกิตติ ไสกระจำง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๒๔๓๐๓๓
๓.นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๒๕๕๐๐๕

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด -

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ

คงเหลืองบประมาณ -

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕

ผลการดำเนินงาน

๑.ประชุมทบทวนการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการของกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกร อาคารอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

๒.ประชุมเตรียมความพร้อมการขออนุมัติโครงการของกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๓.ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกพื้นที่และเป้าหมายตามกิจกรรมในโครงการของกลุ่มจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ

ปัญหา/อุปสรรค -

ลงชื่อ ประวีณ เขียวขำ ผู้รายงาน

(นายประวีณ เขียวขำ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม ๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางแยกอนุพงศ์-ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางถ้ำบอน-แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางศูนย์วิทยุ-เนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๑.๕๐ เมตร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๔) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณฐานอนุพงศ์ (สมรภูมิช่องบก) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๕) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ข้ามห้วยทางขึ้นภูหินต่าง อำเภอภูผาพิทักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ แห่ง



ภาพที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางแยกอนุพงศ์-ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐



ภาพที่ ๒ สร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางถ้ำบอน-แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐



ภาพที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เส้นทางศูนย์วิทยุ-เนิน ๕๐๐



ภาพที่ ๔ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณฐานอนุพงศ์ (สมรภูมิช่องบก)



ภาพที่ ๕ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ข้ามห้วยทางขึ้นภูหินด่าง อำเภอบุณฑริก



ภาพที่ ๖ บริเวณจุดชมวิว เนิน ๕๐๐

๑๐. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๒๔,๓๗๖,๓๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย/สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เมตร แยกอนุพงศ์-ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เมตร ทางบ้าน-แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นเนิน ๕๐๐ เมตร ทางศูนย์วิทยุ-เนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๑.๕๐ เมตร อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๔) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณฐานอนุพงศ์ (สมรภูมิช่องบก) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

๕) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ข้ามห้วยทางขึ้นภูหินด่าง อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ แห่ง พบว่า กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้อุทยานภูจองนายอยดำเนินการเรื่องมอบสิทธิประโยชน์ให้เรียบร้อยต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัด อุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางจากศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยถึงบริเวณเนิน ๕๐๐ (สุดเขตต้นไม้) ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๑.๕ เมตร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางแยกอนุพงศ์-ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางลำบอน-แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ (สม.รมูมิช่องบก) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๕. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ข้ามห้วยทางชันภูหินด่าง อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ แห่ง
รายการภายใต้กิจกรรม -
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๓๗๖,๓๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบ นายจินฉะ สามศรี
โทรศัพท์ ๐ ๘๗๘๗ ๒๖๐๙๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สัญญาเริ่มต้น ๐๘/๐๒/๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๓/๐๑/๒๕๖๓
งบประมาณก่อกำหนดผู้กผัน ๒๓,๙๒๔,๑๕๖.๓๔ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๓,๙๒๔,๑๕๖.๓๔ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์)
คงเหลืองบประมาณ ๔๕๒,๑๕๓.๖๖ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

๑. นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. นักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ

ผลผลิต

๑. ได้รับการพัฒนาเส้นทางแยกฐานอนุพงศ์-ศูนย์วิทยุเนิน ๕๐๐ ระยะทาง ๓.๕๐ กิโลเมตร ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร จากเดิมเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นเส้นทางคอนกรีต
๒. ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางลำบอน-แยกก่อนถึงศูนย์วิทยุเนิน

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประชุมขอทราบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะร่วมนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ (๒๕๖๒)

- กิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (๒๕๖๑)

-กิจกรรมพัฒนาสวนพุทธรูทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูสู่วัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๓.โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (๒๕๖๒)

๔.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒๕๖๓)

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์



ภาพที่ ๓ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์




ภาพที่ ๔ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์

แบบผังบริเวณ (เต็ม)



งานปรับแก้แบบผังบริเวณ (ใหม่)

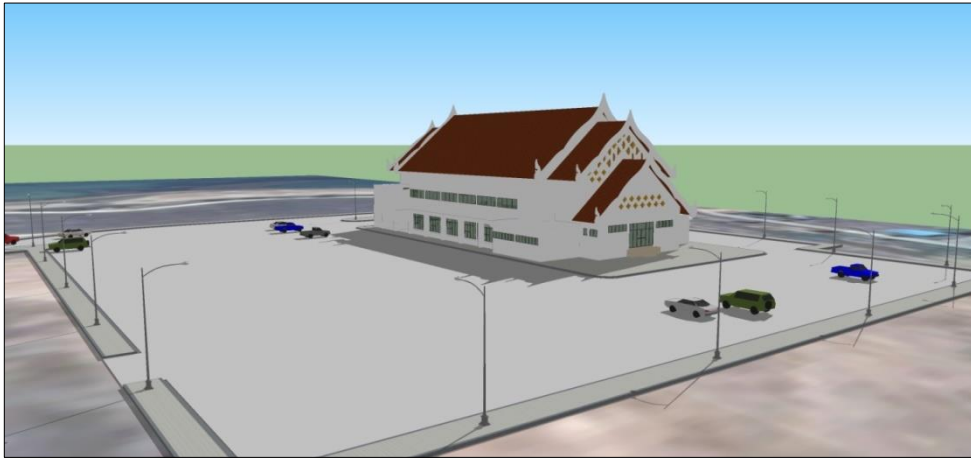

๑.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๕.๕๐ ซึ่งช้ากว่าแผนและมีการแก้ไขแบบใหม่ซึ่งไม่กระทบแผน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรมตกแต่ง,งานระบบประปา-สุขาภิบาล, งานไฟฟ้าและ
สื่อสาร ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
จะรับมอบดูแลรับผิดชอบต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดหน่วยดำเนินงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรม : พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ

(ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๖๓-๕๕๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนผูกพัน ๓๖,๒๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ -

คงเหลืองบประมาณ ๓๖,๒๑๐,๐๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๗

ผลการดำเนินงาน ๑. งานปรับปรุงโครงสร้างเดิม

๒. งานสถาปัตยกรรมตกแต่ง

๓. งานระบบประปา-สุขาภิบาล

๔. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

๕. งานระบบปรับอากาศ

๖. งานปรับปรุงผังบริเวณ

๗. งานครุภัณฑ์

ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

ลงชื่อ ชลากร บุญยะมาตย์ ผู้รายงาน

(นายชลากร บุญยะมาตย์)

๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒)



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way

๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ ๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒)

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูสู่วัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒) ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๓ เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญาและได้ทำประมาณการราคามูลค่างานคงเหลือ เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมอบให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญดูแลต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้รับจ้างเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง
๒. ผู้รับจ้างดำเนินการ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๗๖.๕ และจากระยะเวลาที่เหลือจะสิ้นสุดสัญญา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ คาดว่าโครงการจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
๓. หน่วยดำเนินการได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยหนังสือแล้ว ๓ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินโครงการพิจารณาแจ้งยกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน และพิจารณาขึ้นบัญชี ผู้รับจ้างรายดังกล่าวเป็นผู้รับจ้างที่ทำงานกับกระทรวงการคลังต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสวนพุดอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAYประตูสู่วัฒนธรรม (ระยะที่ ๒)
กิจกรรม : พัฒนาสวนพุดอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAYประตูสู่วัฒนธรรม (ระยะที่ ๒)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้รับผิดชอบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ ๐๘๘-๙๖๓-๕๕๑๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สัญญาเริ่มต้น ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน ๘,๔๓๘,๗๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๐๒๕,๒๘๖ บาท
คงเหลืองบประมาณ ๖,๔๑๓,๔๑๔ บาท
ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐
ผลการดำเนินงาน ๑. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
๒. งาน สร้างศาลาอเนกประสงค์จำนวน ๒ หลัง

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานโดยต่อเนื่องและไม่ส่งมอบงานตามกำหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ลงชื่อ ชลากร บุญยะมาตย์ ผู้รายงาน
(นายชลากร บุญยะมาตย์)

๓. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๓ ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปกล้วย จากกลุ่มทนายสาวกล้วยแชบ



ภาพที่ ๔ กลุ่มแปรรูปกล้วยกลุ่มทนายสาวกล้วยแชบ

๓.โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๗๓๔,๙๕๐ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มในพื้นที่อำเภอเสนางนิคมและกลุ่มในอำเภอขามานซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้นิเทศและติดตามโครงการฯ ณ กลุ่มทนายสาวกล้วยแขก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปกล้วยทำให้แปรรูปสินค้าได้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ซึ่งการแปรรูปกล้วยได้มีการจำหน่ายในพื้นที่ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนราว ๒๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญช่วยหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มสามารถมีแหล่งขายที่เยอะและหลากหลายมากขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๔,๙๕๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๖๙-๗๕๑๔

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น -

งบประมาณที่ก่องนี้ผูกพัน -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๗๑๔,๙๕๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงาน ๑. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

๒. โต๊ะผิวหน้าหุ้มสแตนเลส

๓. เต้าแก๊สถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์

๔. เครื่องชั่งดิจิตอล

๕. เครื่องซิลปากถุง

ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

ลงชื่อ ชลากร บุญยะมาตย์ ผู้รายงาน
(นายชลากร บุญยะมาตย์)

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๗,๕๙๐,๔๙๙ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้เข้าประเมินความพร้อมของโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายรายเก่า คือ เกษตรกรกลุ่มข้าว GPS บ้านหนองคู ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๓๐ คน ลักษณะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ในนาข้าว พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียน ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งจากการประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว สมาชิกในกลุ่มมีความพร้อมและสนใจอย่างมากในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้งบประมาณแล้วให้ดำเนินการตามแผน

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๙๐,๔๙๙ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๖๙-๗๕๑๔

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น -

งบประมาณที่ก่องนี้ผูกพัน -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ -

คงเหลืองบประมาณ -

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ -

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

ลงชื่อ ชลากร บุญยะมาตย์ ผู้รายงาน
(นายชลากร บุญยะมาตย์)
