



รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ

(โขง ชี มูล)

คำนำ

เอกสารสรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มนี้ จัดทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ประสาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๙ (๓) บัญญัติว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด

หากเอกสารเล่มนี้ ยังขาดข้อมูลและมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหากท่านคิดว่าสิ่งใดที่จะมีคุณค่า และมีประโยชน์ที่สมควรปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นในโอกาสต่อไป

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดฯ	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓	
๒.๑ จังหวัดอำนาจเจริญ	๘
๒.๒ จังหวัดยโสธร	๒๘
๒.๓ จังหวัดอุบลราชธานี	๔๖
๒.๔ จังหวัดศรีสะเกษ	๖๘

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑. ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๑๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทยที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย

การจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้ บังเกิดผลโดยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่ม จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ

๒. ลักษณะทางกายภาพ

ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ตั้งอยู่ในตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๓๑,๙๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๙,๙๔๒,๓๓๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ ๖.๒ ของพื้นที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ระยะทางรวม ๖๐๑ กิโลเมตร ดังนี้

จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระยะทาง ๓๖๑ กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร

จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร

จังหวัดอำนาจเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักร กัมพูชา

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและสุรินทร์

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา


ขนาดพื้นที่

กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๕๙๒ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๕๗๕ กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่รวมกันประมาณ ๓๑,๙๐๗.๗๒๘ ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๔ รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ ๒๗.๗๐ จังหวัดยโสธร ร้อยละ ๑๓.๐๔ และจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ ๙.๙๑ ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๑


ตารางที่ ๑ แสดงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ แยกรายจังหวัด

กลุ่มจังหวัด / จังหวัด	เนื้อที่		ร้อยละ (ของกลุ่มจังหวัด)
	ตารางกิโลเมตร	ไร่	
กลุ่มจังหวัดฯ	๓๑,๙๐๗.๗๒๘	๑๙,๙๔๒,๓๓๖	๑๐๐.๐๐
อุบลราชธานี	๑๕,๗๔๔.๘๔๐	๙,๘๔๐,๕๒๖	๔๗.๓๔
ศรีสะเกษ	๘,๘๓๙.๙๗๖	๕,๕๒๔,๙๘๕	๒๗.๗๐
ยโสธร	๔,๑๖๑.๖๔๔	๒,๖๐๑,๐๔๐	๑๓.๐๔
อำนาจเจริญ	๓,๑๖๑.๒๔๘	๑,๙๗๕,๗๔๘	๙.๙๑

ที่มา : สำนักทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙

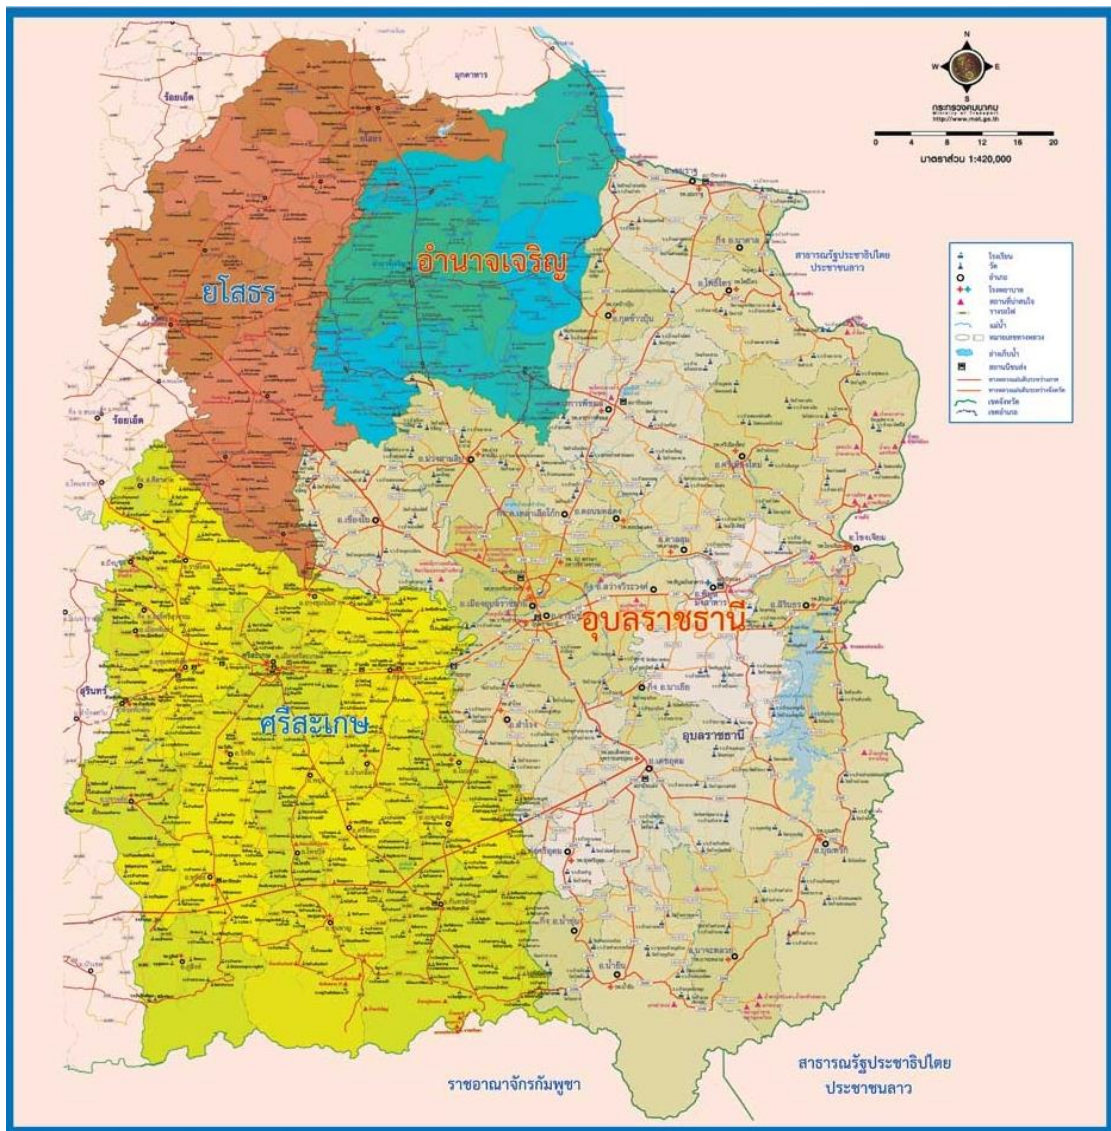

ภาพที่ ๑ แสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

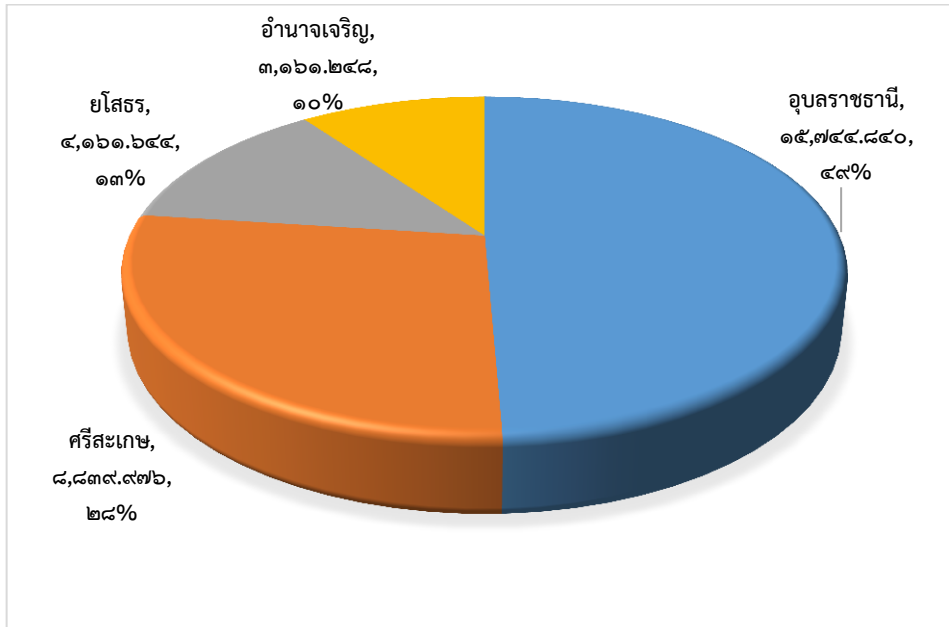

ภาพที่ ๒ สัดส่วนพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กับจังหวัดอุดรราชธานี (ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๘ กิโลเมตร โดยจังหวัดที่ห่างจากศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดยโสธร ๙๖.๙๖ กิโลเมตร จังหวัดอำนาจเจริญ ๗๙.๔๕ กิโลเมตร และจังหวัดศรีสะเกษ ใกล้ที่สุด ๖๗.๓๑ กิโลเมตร

ตารางที่ ๒ ระยะทางระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กับศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด

จังหวัด	ระยะทางห่างจากศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
ศรีสะเกษ	๖๗.๓๑ กิโลเมตร
ยโสธร	๙๖.๙๖ กิโลเมตร
อำนาจเจริญ	๗๙.๔๕ กิโลเมตร

ที่มา : กรมทางหลวง <http://dohgis.doh.go.th/dohtotravel/> สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีสนามบินพาณิชย์ ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดอุดรราชธานี และในปัจจุบัน มีสายการบิน ๔ สาย คือ นกแอร์ , ไทยแอร์เอเชีย , ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยสมายล์ ทำอากาศยานนานาชาติอุดรราชธานี มีรันเวย์ขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัด อุดรราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยสามารถรองรับผู้โดยสาร ทั้งขาเข้า และขาออกได้ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ต่อชั่วโมง หรือ ขาเข้า ๕๐๐ - ขาออก ๕๐๐ คน

ลักษณะภูมิประเทศ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกลงทางทิศตะวันออก พื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพป่าและภูเขา มีแหล่งน้ำขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ำสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้ำ

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin) สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงต่ำสลับกัน ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูล ไหลผ่านกลางจังหวัด จากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก ไหลลงสู่มแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาซับซ้อนหลายแห่งบริเวณชายแดนทางตอนใต้ มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๕,๓๔๐.๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๓๗,๙๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ พื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๗๒๑.๘๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕๑,๑๗๒ ไร่ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘.๑๗ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เป็นที่อาศัยและอื่น ๆ อีกประมาณ ๒,๗๗๗.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๓๕,๘๔๐ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๒ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด บริเวณที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นบริเวณแม่น้ำมูล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอราศีไศล อยางชุมน้อยและกันทรารมย์ เทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ด้านใต้ของจังหวัด กั้นเขตแดนไทย - กัมพูชา

จังหวัดยโสธร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง โดยมีพื้นที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีแม่น้ำชี ไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัด อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๒๗ ฟุต มีพื้นที่เป็นภูเขา บางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัดอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม สสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ ทำการเกษตรไม่ค่อยดีนัก

จังหวัดอำนาจเจริญ มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวไปจรดจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอชานุมาน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ ๖๘ เมตร สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังบางส่วน มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้นจังหวัดอำนาจเจริญกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อำเภอชานุมาน

ลักษณะภูมิอากาศ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีลักษณะภูมิอากาศร้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๑๒.๑ - ๔๑.๑ องศาเซลเซียส

จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดอื่น ๆ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม จากนั้นจะเริ่มร้อนอบอ้าวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๕.๘ - ๓๕.๔ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๓๑.๐-๙๖.๐ สภาพอากาศของศรีสะเกษแบ่งเป็น ๓ ฤดู โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

จังหวัดยโสธร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าโปร่ง อากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิระหว่าง ๑๒.๑ - ๔๑.๑ องศาเซลเซียส

จังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างชัดเจนมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น ๓ ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ณ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ประชุมขอทราบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)

- กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

(หน่วยดำเนินงานจะรายงานการดำเนินโครงการในที่ประชุม)

๒. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ (๒๕๖๒)

- กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

(จุดดูงาน สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๒๕๖๑)

- กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ระยะที่ ๒)

(จุดดูงาน พุทธอุทยานและพระมณฑปเมือง)

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนากาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (๒๕๖๓)

- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

(จุดดูงาน กลุ่มแปรรูปปลา อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ)

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๔,๓๖๔,๙๔๕ บาท

กิจกรรม ๑. การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ

๒. การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ

๓. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้

(๑) การพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ เป็นการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP กำหนดการดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำหนดการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

(๒) การจ้างเหมา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

(๓) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการตามแผนที่วางไว้ภายในกลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการคัดเลือกและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ไม่ได้ลงพื้นที่นี้เทศ ฯ เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญขอรายงานในที่ประชุมฯ แทน)

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัครจริยฝ้ายทอมือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัครจริยฝ้ายทอมือ

งบประมาณ ๑,๕๒๘,๘๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ ๔๘๘,๘๐๐ บาท

๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมที่ ๒ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการพัฒนาระดับ งบประมาณ ๒,๓๔๘,๔๒๐ บาท

๓. กิจกรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ งบประมาณ ๔๘๗,๗๒๕ บาท

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๓๖๔,๙๔๕ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด -

งบประมาณก่อนหักภาษี -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ -

คงเหลืองบประมาณ ๔,๓๖๔,๙๔๕ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัครจริยฝ้ายทอมือแบ่งเป็น
กิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอวิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัครจริยฝ้ายทอมือ
มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ฝึกอบรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ ๔๘๘,๘๐๐ บาท

กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔๐ ผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ
OTOP จำนวน ๘๐ คน ณ โรงแรมฝ้ายชิต อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท

กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔๐ ผลิตภัณฑ์
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ วิธีการดำเนินการ โดยการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
เตรียมประกาศผู้รับจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

๒. กิจกรรมที่ ๒ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ วิธีการดำเนินการ โดยการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เตรียมประกาศผู้รับจ้าง

๓. กิจกรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ วิธีการดำเนินการ โดยการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เตรียมประกาศผู้รับจ้าง
ปัญหา/อุปสรรค -

ลงชื่อ นายพีรภานต์ โคตรโยธา ผู้รายงาน
(นายพีรภานต์ โคตรโยธา)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๒. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์



ภาพที่ ๓ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์




ภาพที่ ๔ บริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์

แบบผังบริเวณ (เดิม)



งานปรับแก้แบบผังบริเวณ (ใหม่)

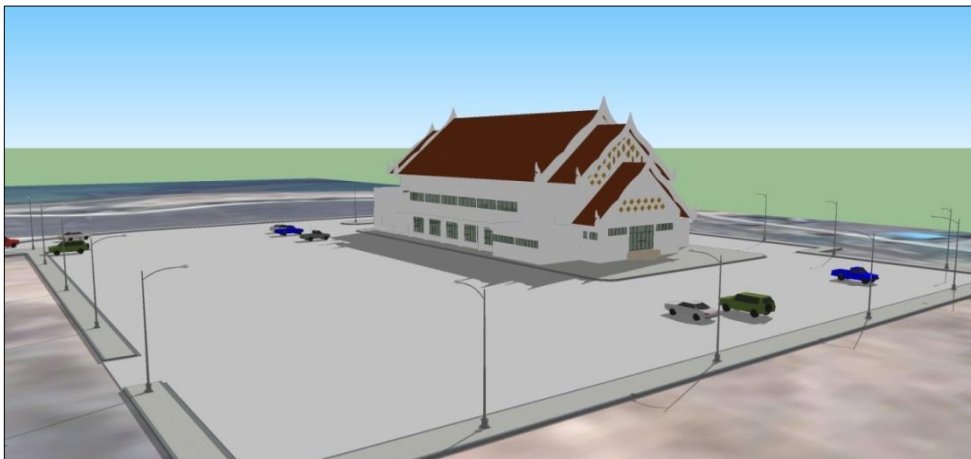

๒. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด
อำนาจเจริญ ผลการดำเนินการร้อยละ ๕๑.๘๒ ของโครงการทั้งหมด ซึ่งช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๔๒ มีการแก้ไข
แบบใหม่ซึ่งไม่กระทบแผนอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรมตกแต่งดำเนินการแล้วเสร็จ,
งานระบบประปา - สุขาภิบาลดำเนินการแล้วเสร็จ , งานไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ คงเหลืองาน
ปรับปรุงผังบริเวณ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญจะรับมอบดูแลรับผิดชอบต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

มีการแก้ไขรูปแบบอาคารใหม่ซึ่งไม่กระทบแผนซึ่งอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอำนาจเจริญ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ

(ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ : (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) สวนสวนเฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ : นายปรพล เจริญพงษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ : ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓

ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ งวดงาน

ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน : ๔๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ๑๔,๕๖๗,๕๖๓.๘๘ คิดเป็น ๓๔.๒๐ % (เบิกแล้ว ๑.๕ % และส่งงานแล้ว ๙ งวด)

คงเหลืองบประมาณ : ๒๘,๐๓๒,๔๓๖ บาท คิดเป็น ๖๕.๘๐ % (คงเหลือยังไม่ส่งมอบงาน ๒๓ งวด)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ : ๕๑.๙๒ % ของโครงการทั้งหมด งานช้ากว่าแผน -๓.๔๒ %

ผลการดำเนินงาน :

รายการ	สัดส่วนของงาน %	ผลงาน %
งานอาคารอเนกประสงค์	๔๙.๙๒	๑๔.๘๗
งานผังบริเวณ	๓๕.๖๘	๒๘.๘๒
งานอาคารเก็บพัสดุ	๕.๒๘	๔.๘๖
งานครุภัณฑ์	๘.๕๑	๐
งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	๐.๖๑	๐.๓๗
รวม	๑๐๐	๕๑.๙๒

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางแก้ไข -

ลงชื่อ นายเผด็จจิตร กาญจนสุนทร ผู้รายงาน
(นายเผด็จจิตร กาญจนสุนทร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตุสู่วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒)



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way

๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ ๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู่วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒)

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูสู่วัฒนธรรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๒) ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๒ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานและได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม และได้ทำประมาณการราคามูลค่างานคงเหลือให้ผู้รับจ้างรายใหม่เรียบร้อยแล้วลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน จำนวน ๙ งานอยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างรายเก่าเรียบร้อยแล้วเนื่องจากไม่เข้าดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินโครงการเร่งรัดผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอำนาจเจริญ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประติมากรรม (ระยะที่ ๒)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

รายการภายใต้กิจกรรม :

๑. งานปรับปรุงบริเวณและส่งเสริมกิจกรรม

๒. งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ : นายปรพล เจริญพงษ์ ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ : ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓

ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๑

สัญญาเริ่มต้น : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ งวดงาน

งบประมาณกอหนี้ผูกพัน : ๘,๔๓๘,๗๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ๒,๐๒๕,๒๘๖ บาท คิดเป็น ๒๕.๖๖ %

คงเหลืองบประมาณ : ๕,๘๖๘,๐๑๔ บาท คิดเป็น ๗๔.๓๔ %

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ : ๓๒ ของโครงการทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน :

๑. งานอาคารอเนกประสงค์ อาคาร A ดำเนินการก่อสร้าง ถึงส่วนของโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณแล้ว
เสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๒. งานอาคารอเนกประสงค์ อาคาร B ดำเนินการก่อสร้าง ถึงส่วนของโครงหลังคาเหล็กติดตั้งจันทัน
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๓. งานปรับปรุงบริเวณและลานส่งเสริมกิจกรรม ดำเนินการก่อสร้างราวสแตนเลสบริเวณอิมเจอร์รี่
ลานหิน แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงานจำนวน ๑ ครั้ง รวม ๓ งวด เป็นเงิน ๒,๐๒๕,๒๘๖ บาท

หักค่าปรับ ๖๗๑,๕๕๔.๙๒ บาท จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ๑,๓๕๓,๗๓๑.๐๘ บาท

(หักค่าปรับ ๘๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๕. ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

โครงการเดิม

งบประมาณ ๗,๘๙๓,๓๖๔ บาท

๑. บอกละเอียดสัญญาจ้างแล้ว คงเหลือยังไม่เบิก ๕,๘๖๘,๐๗๘ บาท
๒. คิดค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำแล้ว ก่อนบอกละเอียดสัญญา ๕๘๑,๒๘๑.๕๕ บาท
๓. นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน คงเหลืองบประมาณ ๕,๒๘๖,๗๙๖.๕๕ บาท
๔. อยู่ระหว่างแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงานแล้ว
๕. อยู่ระหว่างแจ้งค่าเสียหายให้ผู้รับจ้างมาชำระค่ารับ เป็นเงิน ๑,๑๓๙,๔๗๐.๙๓ บาท
(ให้เวลา ๓๐ วัน ถ้าเกินกำหนดจะดำเนินการฟ้องร้อง)
๖. อยู่ระหว่างแจ้งธนาคารฯ เพื่อรับหลักประกันสัญญา ๔๒๑,๙๓๕ บาท
(ให้เวลา ๓๐ วัน ถ้าเกินกำหนดจะดำเนินการฟ้องร้อง)

โครงการใหม่

งบประมาณ ๕,๒๘๖,๗๙๖.๕๕ บาท

๑. ผู้รับจ้าง บริษัท บุษยาการสร้ง จำกัด
๒. ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เริ่มสัญญา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
กำหนดแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน จำนวน ๙ งวดงาน
๓. อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางแก้ไข -

ลงชื่อ นางสาวธำปณี น้อยพินิจ ผู้รายงาน
(นางสาวธำปณี น้อยพินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร



ภาพที่ ๑ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ ปลาที่ได้จากการแปรรูป อาทิ ปลาต้ม ปลาแดดเดียว

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๖๕๔,๒๗๕ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามัคคี พัฒนาอาชีพ มีรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผลิตพัฒนาที่ได้จากการแปรรูปของกลุ่มฯ เช่น ปลาต้ม (ปลาตะเพียน ปลาเทโพ ปลายี่สก) ปลาตากแห้ง (ปลากด ปลาเนื้ออ่อน ปลาหลด ปลาร้ากล้วย) ปลาร้า ปลาร้าบอง และกล้วยตาก ซึ่งเป็นปลาที่หาได้ตามฤดูกาล ซึ่งกระบวนการทำจะปลอดสารพิษ ไม่มีสีผสมอาหาร ไม่ใส่ดินประสีว จะใช้น้ำขาวข้าวแทนและเน้นกระบวนการคั้นแบบใช้มือขนาดตามแบบดั้งเดิม ซึ่งยังขาดบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ในการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การขายมีการต่อยอดเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการจำหน่ายในพื้นที่ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนราว ๑๕,๗๙๕ บาท/เดือน

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้สามารถมีแหล่งขายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอำนาจเจริญ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากิจการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๖๕๔,๒๗๕ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้รับผิดชอบ : นายสำพรต จันทร์หอม ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์ : ๐-๔๕๕๕๒-๓๐๑๔

ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น : -

งบประมาณก่อนนี้ผู้กพัน : -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : -

คงเหลืองบประมาณ : -

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ : -

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการใหม่ ตามยอดวงเงินงบประมาณคงเหลือจาก
การปรับลดงบประมาณ เพื่อนำเข้า พ.ร.บ โอนงบประมาณ พ.ศ.

ปัญหา/อุปสรรค -

แนวทางแก้ไข -

ลงชื่อ ชลากร บุญยะมาตย์ ผู้รายงาน
(ชลากร บุญยะมาตย์)

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดยโสธร
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ประชุมขอทราบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดยโสธร

- คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (๒๕๖๓)

- กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

(จุดดูงาน กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งแต่ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแต่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร)

๒. โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี (๒๕๖๓)

- กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสาร
เพื่อเด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี

(จุดดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)

- กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ

- บ้านสวน จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร

(จุดดูงาน บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร)

๔. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)

- กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

(จุดดูงาน กลุ่มทอผ้าไหม บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร)

เวลา ๑๗.๓๐ น.- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

๑. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๖๓๘,๑๐๐ บาท

กิจกรรม การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

หน่วยดำเนินการ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งแต่ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งแต่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ (การปลูกข้าวอินทรีย์) ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรได้มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ ราย เป็นการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ และได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาตะเพียนและร้าอ่อน นำมาเลี้ยงในนาข้าวอินทรีย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางให้กับเกษตรกร

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกษตรกรต้องอาศัยน้ำฝนในทำเกษตร ทำให้การดำเนินงานอาจมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรกรอินทรีย์

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตเกษตรกรอินทรีย์

กิจกรรมย่อย การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

รายการภายใต้กิจกรรม

- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ ราย
- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
 - สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน รายละเอียด ๑,๕๐๐ ตัว
 - รำอ่อน (รำอินทรีย์) รายละเอียด ๕๐ กก.

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๓๘,๑๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ นายสุพรม พวงอินทร์ ตำแหน่ง ประมงจังหวัดยโสธร

โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๘๐๒๑๘-๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน -

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๙,๙๕๘ บาท

คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๖๑๘,๑๔๒ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรครบทั้ง ๒๐๐ ราย
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่าพื้นที่นาของเกษตรกรยังมีน้ำไม่เพียงพอ

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากเกษตรกรต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนในการทำนาทำให้พื้นที่ดำเนินการไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ ทำให้การดำเนินงานอาจจะล่าช้าไปบ้าง

ลงชื่อ ชัยณรงค์ ชื่นชม ผู้รายงาน
(นายชัยณรงค์ ชื่นชม)

๒. โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้วล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใยสื่อสารเพื่อเด็กไทย
พัฒนาการสมวัย IQ ดี

กิจกรรม โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้วล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใยสื่อสารเพื่อเด็กไทย
พัฒนาการสมวัย IQ ดี



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

๒. โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๔๐,๑๑๕,๔๐๐ บาท

กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสารเพื่อเด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี
หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ มกราคม ๒๕๖๓

สัญญาสิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ล้อมรัก อุ๋นไอรัก สายใยสื่อสารเพื่อเด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อดิจิทัลประเมินผลและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (DSPM) , จัดซื้ออุปกรณ์สื่อดิจิทัลเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย

ปัญหา/อุปสรรค

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีผลทำให้มีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ โครงการ มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ ล้อมรัก อุ้มโอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อ
เด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี
กิจกรรม มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ ล้อมรัก อุ้มโอรัก สายใยสื่อสาร เพื่อเด็กไทย
พัฒนาการสมวัย IQ ดี
รายการภายใต้กิจกรรม

๑. สร้างภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหัศจรรย์
๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "รอบรู้ ล้อมรัก อุ้มโอรัก สายใยสื่อสารสามวัย " (วัยเด็ก,วัย
ผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ)
 - ๒.๑. จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (DSPM)
 - ๒.๒. จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก
๓. ประชุมแกนนำ และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมกระบวนการเวทีครอบครัว เพื่อพัฒนาด้าน
สติปัญญา จิตใจและอารมณ์
๔. ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตาย
ยาย ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง แกนนำชุมชน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๗๑,๑๐๐ บาท(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ผู้รับผิดชอบ นางสิรินทร์ฉัตร มีแนว
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๖๑๔๖๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สัญญาเริ่มต้น มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๓
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๒๖๔,๐๐๐.-บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๙๖๕,๐๐๐.-บาท
คงเหลืองบประมาณ ๑,๓๐๖,๑๐๐.-บาท
ความก้าวหน้าของโครงการคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๕
ผลการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการเสร็จแล้ว
 - ๑.๑. จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก(DSPM) จำนวน ๑๐๐
ชุด
 - ๑.๒. จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการเล่านิทานส่งเสริมพัฒนาการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก
จำนวน ๑๒๓ ชุด

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑. อยู่ระหว่างยื่นก่อนนี้ผูกพัน

๒.๒. กำหนดแผนการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ (๑)สร้างภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหัตถ์จรรยา ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต (๒)ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รอบรู้ ส้อมรัก อุ้มไอรัก สายใยสื่อสารสามวัย ” (วัยเด็ก,วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ) (๓)ประชุมแกนนำ และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรม กระบวนการเวทีครอบครัว เพื่อพัฒนาต้นตอปัญหา จิตใจและอารมณ์ (๔)ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มศักยภาพให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง แกนนำชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีผลให้เลื่อน ระยะเวลาดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสิรินทร์ฉัตร มีแก้ว)

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน
จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน

จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน จังหวัดยโสธร ระหว่าง กม. ๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร พื้นที่ เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรปริมาณมาก โดยทำการซ่อมและทำพื้นทางใหม่ ปัจจุบันการดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน แขวงทางหลวงยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ-บ้านสวน จังหวัด
ยโสธร ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๐๐-กม.๒๑๑+๕๐๐RT. (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๕.๕๒๕ กิโลเมตร
รายการภายใต้กิจกรรม -

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงยโสธร

ผู้รับผิดชอบ นายปัญญา หวังดี

โทรศัพท์ ๐๙-๖๑๙๑-๙๙๒๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

งบประมาณก่องนี้ผูกพัน ๒๔,๙๗๙,๑๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๔,๙๗๙,๑๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายปัญญา หวังดี)

๔. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิธีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉรย์



ภาพที่ ๑ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ภาพที่ ๒ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ภาพที่ ๓ ผ้าไหมที่ทำการย้อมสีจากธรรมชาติ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๕ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ มัดย้อม กระเป๋า



ภาพที่ ๖ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ มัดย้อม กระเป๋า

๔. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๔,๓๖๔,๙๔๕ บาท

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ เป็นการดำเนินการของกลุ่มทอผ้าไหม บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีสมาชิกทั้งหมด ๒๙ คน ผลิตภัณฑ์ที่ทำ อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดย้อม การแปรรูปกระเป่า ก๊ัพซ้อป เป็นการย้อมสีธรรมชาติ และไม้ธรรมชาติ (สารเคมี) ซึ่งได้มีการไลฟ์สดขายผ่านช่องทางออนไลน์และมีฐานลูกค้าในการจัดจำหน่ายที่เหนียวแน่น

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ช่วยผลักดันช่องทางในการจัดจำหน่ายให้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อศจจรยฝ้ายหอม

รายการรายได้กิจกรรม

๑. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ งบประมาณ ๑,๕๒๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน-สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. กิจกรรมที่ ๒ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ยกระดับ จำนวน ๑ ครั้ง (ในประเทศ) งบประมาณ ๒,๓๔๘,๔๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อย-
ยี่สิบบาทถ้วน)

๓. กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (แผ่นพับ/สื่อโทรทัศน์) งบประมาณ ๔๘๗,๗๒๕ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๖๔,๙๒๕ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

ผู้รับผิดชอบ. ๑. นายสมบัติ จงจินากุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๒๒ ๔๑๗๕

๒. นายชาวิช จันทร์แสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๗๗ ๕๗๗๙

ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คงเหลืองบประมาณ ๓,๘๘๘,๙๒๕ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๐

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
ประเภทผ้า จำนวน ๔๐ กลุ่ม ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๘๐ คน

/แผนการ...

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

-๒-

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๒ การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
จำนวน ๑ ครั้ง (ในประเทศ) กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๓ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จ้างเหมาจัดทำสื่อ แผ่นพับ/แคตตาล็อก/สื่อโทรทัศน์ กำหนด
ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพนม สิงห์สาย)

พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว (๒๕๖๓)

-กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

(จุดดูงาน กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี)

๒. โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒๕๖๓)

-กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

(จุดดูงาน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๓. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม (๒๕๖๓)

-กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง
๒.๒๖๐ กิโลเมตร

(จุดดูงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ)

๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน (๒๕๕๙)

-กิจกรรม ก่อสร้างพุทธรมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)

(จุดดูงาน ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี)

เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ



ภาพที่ ๕ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ



ภาพที่ ๖ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๑. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๔,๕๖๘,๕๖๕ บาท

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ โดยกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกในหลายกลุ่ม ซึ่งทำการทอผ้าและอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีหลายมีหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าถุง กระเป๋า เสื้อ ผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งได้มีการไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้มีช่องทางการขายที่เพิ่มมากขึ้นรายได้หมุนเวียนภายในกลุ่มมากขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันช่องทางในการจัดจำหน่ายเพื่อให้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด อุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม พัฒนาระดับคุณภาพผ้าทอ วิถีลุ่มน้ำโขง ซี มูล อัจฉริยะฝ้ายทอมือ
ภายใต้กิจกรรม

๑.การพัฒนากระดับคุณภาพผ้าทอ จำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์

๒.การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ ที่จังหวัด
ขอนแก่น จำนวน ๑ ครั้ง

๓. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (จัดทำแคตตาล็อก/สื่อวีดิทัศน์)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๖๘,๕๖๕ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ ๐๘๔- ๘๗๔๐๕๗๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น

๑.จ้างออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ เริ่มสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

๒.จ้างเหมาประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

๓.จ้างเหมาจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๔๑.๒๓

คงเหลืองบประมาณ ๒,๖๘๔,๕๖๕ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓

ผลการดำเนินงาน

๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผ้าในการยกระดับคุณภาพผ้าทอ จำนวน ๕๐ กลุ่ม ๆ ละ ๒ คน
รวม ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๕ วัน

๒.จัดทำ PO ในการจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์

๓.กิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำแคตตาล็อก ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรมการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากจะได้รับการจ้าง
และลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายคมกริช จินชนะ)

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์



ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๒ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๓ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๔ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



ภาพที่ ๕ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์ตัวอย่าง



ภาพที่ ๖ พื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์ตัวอย่าง

๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๐,๙๒๓,๖๖๑ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการทั้งหมด ๕ กิจกรรมหลัก คือ

๑. การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นการพัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS , การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม , พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ , มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยและ ผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม

๒. การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ เป็นการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS,การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม , มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยและ ผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม

๓.การผลิตพืชผักอินทรีย์ เป็นการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ ๙๐๐๐ เล่ม - ๒๕๕๒ , ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์

๔. การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ เป็นการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ , ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์

๕. การผลิตผลไม้อินทรีย์ เป็นการอบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร , ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ , จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า

๒. ควรมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในการดำเนินโครงการให้แก่เกษตรกร

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการให้ครบทั้ง ๕ กิจกรรมตามแผนงานที่วางเอาไว้ เพราะในปัจจุบันประชาชนหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นจะทำให้สมาชิกภายในกลุ่มมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
รายการภายใต้กิจกรรม

- ๑) การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๙,๗๗๓,๖๐๐ บาท
 - ๑.๑) พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS จำนวน ๓ ครั้ง งบประมาณ ๔,๙๑๔,๐๐๐ บาท
 - ๑.๑.๒) การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม งบประมาณ ๒,๖๔๕,๕๐๐ บาท
 - ๑.๑.๓) มุลตนิเกษตรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
 - ๑.๔) พัฒนาเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จำนวน ๖ ครั้ง งบประมาณ ๗๒๑,๖๐๐ บาท
 - ๑.๕) การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ ๙๑๓,๐๐๐ บาท
 - ๑.๖) การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ งบประมาณ ๕๓๙,๕๐๐ บาท
- ๒) การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๖๐๙,๑๖๑ บาท
 - ๒.๑) อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS จำนวน ๔ ครั้ง งบประมาณ ๕,๐๖๙,๒๐๐ บาท
 - ๒.๑.๒) การตรวจรับรองมาตรฐาน PGS ภายในกลุ่ม งบประมาณ ๒,๑๒๗,๔๔๐ บาท
 - ๒.๑.๓) มุลตนิเกษตรอินทรีย์ไทยและผู้มีส่วนได้เสียตรวจเยี่ยมฟาร์ม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
 - ๒.๔) การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ งบประมาณ ๓๗๒,๕๒๑ บาท
- ๓) การผลิตพืชผักอินทรีย์ งบประมาณ ๑,๙๐๔,๑๐๐ บาท
 - ๓.๑) อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกช ๙๐๐๐ เล่ม-๒๕๕๒ จำนวน ๔ ครั้ง งบประมาณ ๘๘๑,๑๐๐ บาท
 - ๓.๒) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ ๙๕๗,๐๐๐ บาท
 - ๓.๓) การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท
- ๔) การผลิตสมุนไพรอินทรีย์ งบประมาณ ๖๖๖,๙๐๐ บาท
 - ๔.๑) อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรรองรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๔ ครั้ง งบประมาณ ๕๓๗,๖๐๐ บาท
 - ๔.๒) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๔.๓) การบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการของจังหวัด/อำเภอ งบประมาณ ๒๙,๓๐๐ บาท

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

-๒-

๕) การผลิตไม้ผลอินทรีย์ งบประมาณ ๒๑๖,๖๐๐ บาท

๕.๑) อบรมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จำนวน ๖ ครั้ง งบประมาณ

๑๑๕,๒๐๐ บาท

๕.๒) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

๕.๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่าย งบประมาณ ๓๓,๔๐๐ บาท

๕.๔) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๑๗๐,๓๖๑ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ นายประวิณ เขียวขำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๙๔๒๐๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้นสิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน-.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

คงเหลืองบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๓๖๑ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติหลักการต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีการทบทวนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ถูกตัดคืนงบประมาณไปจำนวน ๑๖,๔๒๐,๕๖๑ บาท จึงต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการใหม่ตามกิจกรรมและงบประมาณที่คงเหลือ ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ นายประวิณ เขียวขำ ผู้รายงาน

(นายประวิณ เขียวขำ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

๓. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชिरาลงกรณ์ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๕ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ



ภาพที่ ๖ บริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๓. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ - บรรจบโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ - บรรจบโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๔ งานกรุยทางถมป่า งานปรับแก้ดิน
และบดอัดคันทางเดิม งานดินตัด ดินถมดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างชั้นรองพื้น
ทางลูกรังและงานระบบระบายน้ำ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

รายการภายใต้กิจกรรม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข๒๓๑-บรรจบโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ นายอดิเทพ ตีระมาตวนิช

โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๒๕๕๓๐๑๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน ๖๙,๙๖๘,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๔๙๕,๒๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๕๙,๔๗๒,๘๐๐ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๕ %

ผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติหน้างานได้ดำเนินงาน งานกรุยทางวางป่า งานปรับแก้สิ่งแต่งและบดอัดคันทางเดิม
งานดินตัด ดินถมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางลูกรังและงานระบบ
ระบายน้ำ

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นายสามารถ สอาดจิต)

๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี



ภาพที่ ๔ บริเวณด้านในพุทธมณฑลอุบลราชธานี ชั้น ๒

๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณ ๑๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒)

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพระพุทธมณฑลอุบลราชธานี

สัญญาเริ่มวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ ๒) ปัจจุบันผลการดำเนินการร้อยละ ๙๐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๕ งาน งานที่ ๖ - ๑๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินการมีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัด.....อุบลราชธานี..... ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

ชื่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน.....

กิจกรรม ๑.กิจกรรมก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุบลราชธานี.....

๒.กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบก่อสร้างอาคารประกอบพุทธมณฑลอุบลราชธานี.....

รายการภายใต้กิจกรรม

๑.....โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน งบประมาณ ๒๕๕๙.....

๒.....โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน งบประมาณ ๒๕๖๒.....

๓.....

๔.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙,๙๑๓,๑๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน).....

๒.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน).....

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี.....

ผู้รับผิดชอบ นายวิรอด ไชยพรรมา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี.....

โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๔๕๕๙๓-๕.....

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙.....

สัญญาเริ่มต้น ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

งบประมาณก่อนหักพัน ๑๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน).....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน).....

คงเหลืองบประมาณ - บาท.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.....

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

สัญญาเริ่มต้น ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....

งบประมาณก่อนหักพัน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....

คงเหลืองบประมาณ - บาท.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.....

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน..... อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงินงวดสุดท้าย.....

ปัญหา/อุปสรรค..... ไม่มี.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..... *Don*ผู้รายงาน
(นางกชพร นามมนตรี)
(.....
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ.....)

ผลการนิเทศติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

๑. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (๒๕๖๒)

-กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน
(จุดดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ)

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน (๒๕๖๓)

-กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน
(จุดดูงาน กลุ่มท้อผ้า ธัญญารินผ้าไหม เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑๐ ตำบลชำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ)

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๔.๐๐ น. - คณะนิเทศและติดตามฯ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ (ต่อ) ดังนี้

๓. โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (๒๕๖๓)

-กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์และก่อสร้างโรงผลิต
(จุดดูงาน โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ)

เวลา ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร
ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนฯ



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนฯ



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ก่อนดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนฯ



ภาพที่ ๔ บริเวณพื้นที่หลังดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนฯ

๑. โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร
ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน

หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม ขุดลอก/คันดินถมบดอัด/งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำ/ก่อสร้างบันไดหินอ่อน ปัจจุบันการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แก้มลิงหนองอะโพนเดิมมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ หลังจากดำเนินการขุดลอกฯ ทำให้ราษฎรมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งและในอนาคตจะมีการจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเลี้ยงสัตว์

ปัญหา/อุปสรรค

ก่อนการดำเนินการมีปัญหาเรื่องที่ดินเพราะก่อนการดำเนินโครงการได้มีประชาชนเข้ามาขอใช้พื้นที่ (ทำนา) เป็นการชั่วคราวต่อมาเมื่อมีการดำเนินโครงการปรากฏว่ามีประชาชนบางกลุ่มคัดค้านการทำโครงการดังกล่าวและได้ยื่นขอความชอบธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษเข้าตรวจสอบสถานะของที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวนี้มีสภาพเป็นที่นา จึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากที่นาให้เป็นไปตามลักษณะโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่กำหนดไว้ก่อนประชาชนจึงยอมให้เข้าดำเนินการในพื้นที่คงเหลือแค่ ๒ ไร่ที่ประชาชนขอซื้อเพื่อทำการเกษตรต่อ

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินโครงการเร่งรัดผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองอะโพน

กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงหนองอะโพนเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำพื้นที่การเกษตร ตำบลผือใหญ่
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

รายการภายใต้กิจกรรม

- ๑ กิจกรรมขุดลอก
- ๒ กิจกรรมคันดินถมบดอัดแน่นพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น
- ๓ กิจกรรมอาคารประกอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ นายณัฏเศรษฐ์ ธีรวัฒน์ธนกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๒๙๑๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สัญญาเริ่มต้น ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

งบประมาณก่อนนี้ผูกพัน ๓,๙๐๘,๓๔๔.๓๓ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๙๐๘,๓๔๔.๓๓ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๓,๐๘๗,๖๕๕.๖๗ บาท

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

ปัญหา/อุปสรรค.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายณัฏเศรษฐ์ ธีรวัฒน์ธนกร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ



๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่อาเซียน
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่อาเซียน



ภาพที่ ๑ บริเวณพื้นที่ดำเนินการกลุ่มทอผ้าัญญารินผ้าไหม



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการกลุ่มทอผ้าัญญารินผ้าไหม

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่อาเซียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่อาเซียน

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ -

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ณ กลุ่มทอผ้า ัญญารินผ้าไหม ตำบลชำ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิสาหกิจชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงระบบนิเวศซึ่งผลิตผ้าทอหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าพันคอปักลาย เสื้อปักลาย กระเป๋า ฯลฯ มีการจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ทำให้มีรายได้หมุนเวียนภายในกลุ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษช่วยผลักดันกลุ่มทอผ้าัญญารินผ้าไหม ให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงอาเซียน

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ
รายการภายใต้กิจกรรม

๑. แลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรม

๒. ออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ

โทรศัพท์ ๐๙๓๓๕๕๙๘๙๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น.....สิ้นสุด.....

งบประมาณก่อนหักเงิน.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐๐ %

คงเหลืองบประมาณ.....

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐๐ %

ปัญหา/อุปสรรค.....

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ)

๓. โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
กิจกรรม กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงผลิต




ภาพที่ ๑ คณะนิเทศฯ รับฟังผลการดำเนินการ ณ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์



ภาพที่ ๒ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต ณ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์



ภาพที่ ๓ บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิต ณ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์

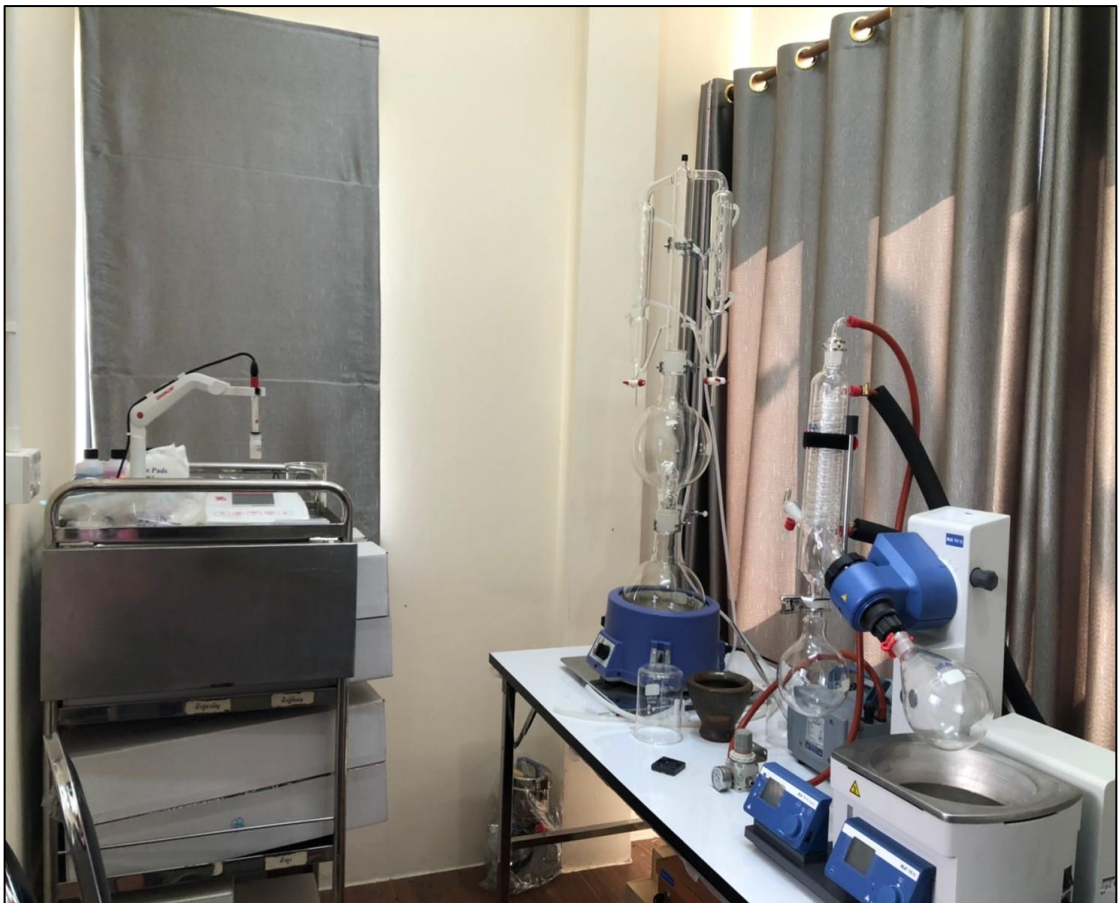

ภาพที่ ๔ ครุภัณฑ์บางรายการ ณ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์

๓. โครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๙,๘๓๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ และก่อสร้างโรงผลิต

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาเริ่มวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาสิ้นสุดวันที่ -

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมแบ่งเป็น ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยวัตถุดิบสมุนไพรจากเกษตรกรเชื่อมโยงเข้าสู่โรงงานแปรรูป พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลขุนหาญ ผลการดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างงวดงานที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒ ขยายและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตของโรงงานผลิตยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบแปรรูปของสมุนไพรของกลุ่มจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลห้วยทับทันผลการดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างงวดงานที่ ๑

กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรพื้นที่ผลิตโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตจากวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรของเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผลการดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างงวดงานที่ ๑

กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพรทั้งกลุ่มจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผลการดำเนินการก่อสร้างอยู่ระหว่างงวดงานที่ ๒

การดำเนินการมีการแปรรูปยาสมุนไพร เครื่องสำอางสมุนไพร การตลาดจะมีการผลักดันเข้าสู่ภาคเอกชน แต่ในขณะนี้ยังจำหน่ายแค่นั้นในโรงพยาบาลของรัฐภายในกลุ่มจังหวัดๆ เท่านั้น ซึ่งจะมีการบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในการปลูกและผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรพื้นที่กำลังการผลิตโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบ
แปรรูปสมุนไพรของเกษตรกรกลุ่มจังหวัด

- อาคารผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๑ หลัง ราคา ๓.๕ ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ ราคา ๑.๕ ล้านบาท รวม ๑๑ รายการ ดำเนินการตรวจรับครบทุกรายการ
เรียบร้อยแล้ว

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้รับผิดชอบ นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาถ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๕-๓๙๐ โทรสาร ๐๔๕-๖๐๕-๓๙๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สัญญาเริ่มต้น ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด - (๒๔ สัญญา)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่เบิกจ่าย

คงเหลืองบประมาณ ๒,๙๕๘,๘๘๘ บาท

ความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ผลการดำเนินงาน

๑. ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๑ รายการ และลงนามสัญญา จำนวน ๑ สัญญา
วงเงิน ๒,๙๕๘,๘๘๘ บาทเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

งวดงานที่ ๑

- รื้อถอน
- สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
- ดินถม-ปรับแก้ที่ดิน ตามสถานที่ก่อสร้างที่กำหนด


แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

- ปังผึ่ง,เสาชิมเจาะ ฐานรากเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอให้เสาชิมแข็งตัวเพื่อที่จะได้กำลังในการรับน้ำหนักและขั้นตอนต่อไปทดสอบการรับน้ำหนักของเสาชิม

๒. ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในส่วนครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ และลงนามสัญญา จำนวน ๔ สัญญา (๑๑ รายการ) วงเงิน ๑,๔๐๘,๙๓๖.๕ บาท รวม ๑๑ รายการ ดำเนินการตรวจรับครบทุกรายการเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้)

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ล่าช้า ทำให้การแจ้งอนุมัติโครงการ และงบประมาณดำเนินการล่าช้าออกไปอีก และการแจ้งรหัสงบประมาณยิ่งล่าช้าไปอีกทำให้การบริหารโครงการ ต้องทำด้วยความเร่งรัด ในส่วนงบลงทุนโครงการก่อสร้างวงเงิน ๑๘ ล้านบาท อาจไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เนื่องจากสัญญาท้ายสุด วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายพัฒนศักดิ์ ทั่งนาค)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

